Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 25 de Agosto de 2023

Señora
Directora General de Administración y Finanzas
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Lic. Edith Leiva
Presente

Ref: Licitación por Concurso de Oferta N° 01/2023 - "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto" ID N° 430.902 – Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en Territorios con Mayor Índice de Pobreza a Nivel Nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas".- CONTRATO N° 01/2023

Me dirijo a usted con el objeto solicitar el Pago del Certificado de Obra N° 01 correspondiente al Lote Nro 1 - Pilar del Contrato de Referencia, cuyo monto asciende a Gs. 29.832.578 Guaraníes Veinte y nueve millones ochocientos treinta y dos mil quinientos setenta y ocho.-

Además presentamos los siguientes documentos:

- Factura Crédito N° 001-001-0001280.
- Certificados de Obra y Acta de Medición en 3 Originales.-
- Certificado de Cumpliendo Tributario
- Reportes FIP y FIS
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social

Sin otro particular, me despido atentamente.-

Ing. Mario R. Ibarrola A.
Director – Propietario y
Representante Legal
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 16 Fecha: 25/08/23 Hora: 10:48
Asunto:
Recibido por: Lucia Ríos

Mario Raúl Ibarrola Adorno

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

Adela Speratti c/ República Francesa N° 1689
Depto. Planta Baja - Tel.: (021) 222 552
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16016326
RUC: 430285 - 0
Inicio de Vigencia: 11 de Noviembre de 2022
Válido Hasta el 30 de Noviembre de 2023

FACTURA

No. 001-001 0001280

Fecha de Emisión: 25/08/2023 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Secretaria Nacional de Vivienda

Dirección: Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad N°.: 800506 10-3 Nota de Remisión N°.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Pago Certificado de Obra Nº 01				
	Contrato Nº 01/2023 Licitacion				
	Por Concurso de Ofertas Nº 01/02				
	"Puesta en Valor de las Bibliotecas				
	Publicas de Pilar y Paso Barreto"				
	ID Nº 430902 - Lote Nº 1 Pilar				29.832.578
SUB TOTAL					29.832.578
TOTAL A PAGAR:	Veinte y nueve millones ochocientos treinta y dos mil quinientos setenta y ocho				29.832.578

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) ——— (10 %) 2.712.053 TOTAL DE IVA: 2.712.053

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. - RUC: 794391 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº 1.366
Independencia Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex 1era.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (0981) 176 811
Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 001-001 - 1.251 al 1.350 - Nov. / 22.

ORIGINAL: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido Como Crédito Fiscal

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2023 "Puesta en Valor de las Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con ID: 430902, CONTRATO N° 01/2023

CERTIFICADO DE OBRA N° 01 **PERIODO: AGOSTO 2023**

LOTE NRO: 1 - PILAR

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01				EJECUTADO						PORCENTAJE %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
		CONTRATO ORIGINAL											
1	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra 0,80 x 1,20 m	Unidad	1	819.000	819.000	0,00	1,00	1,00	0	819.000	819.000	100,00%
2	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos con madera terciada en Sala de lectura	Metros cuadrados	60	32.050	1.923.000	0,00	60,00	60,00	0	1.923.000	1.923.000	100,00%
3	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS: Fumigación contra termitas	Unidad Medida Global	1	2.545.000	2.545.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4	72153901-001	APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN. Apuntalamiento y contención (permanente) del SECTOR C indicado en los planos de intervención. Incluye Diseño, Dimensionamiento, Provisión y colocación según Especificaciones Técnicas.(superficie medible en planta, tener en cuenta que incluye de piso a techo)	Metros cuadrados	75	582.290	43.671.750	0,00	7,50	7,50	0	4.367.175	4.367.175	10,00%
5	72101603-9999	Desmonte de cubierta y todos sus componentes com recuperación, en el sector de la sala de lectura. Incluye desmonte de canaletas.	Metros cuadrados	67	33.355	2.234.785	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6	72101601-002	Desmonte de Cielorraso existente en Sala de Lectura	Metros cuadrados	67	17.010	1.139.670	0,00	67,00	67,00	0	1.139.670	1.139.670	100,00%
7	72131601-008	Retiro de revoque deteriorado y/o incompatible con el soporte.	Metros cuadrados	240	18.350	4.404.000	0,00	36,00	36,00	0	660.600	660.600	15,00%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01				EJECUTADO						PORCENTAJE %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
8	72103003-001	Demolición de piso cerámico en sector posterior a Sala de Lectura Biblioteca (pieza donde está el baño actual a demoler)	Metros cuadrados	31	17.700	548.700	0,00	31,00	31,00	0	548.700	548.700	100,00%
9	72103003-001	Demolicion de puerta y ventana existente en sector posterior a Sala de lectura	Unidad Medida Global	1	165.300	165.300	0,00	1,00	1,00	0	165.300	165.300	100,00%
10	72103003-001	Demolición de baño existente, incluye el desmonte de todos los componentes.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	0,00	1,00	1,00	0	1.300.000	1.300.000	100,00%
11	70111503-002	Desmonte de arbol existente en sector de construccion del baño (incluye desmontar la raiz)	Unidad Medida Global	1	1.533.000	1.533.000	0,00	1,00	1,00	0	1.533.000	1.533.000	100,00%
12	72131601-003	CONSOLIDACION DE CIMIENTO. Submuración de muro en Sala de Lectura según especificaciones técnicas.	Metro lineal	12	582.990	6.995.880	0,00	6,00	6,00	0	3.497.940	3.497.940	50,00%
13	72101703-011	Restauración de lesiones en el soporte murario según modalidades de intervención. Incluye todos los trabajos complementarios necesarios.	Metros cuadrados	60	158.210	9.492.600	0,00	15,00	15,00	0	2.373.150	2.373.150	25,00%
14	72131601-006	Aislacion horizontal de muro (sector de submuración)	Metro lineal	12	38.820	465.840	0,00	6,00	6,00	0	232.920	232.920	50,00%
15	72131601-006	Aislaciones en superficie de fachada (en molduras de fachada)	Metro lineal	34	92.125	3.132.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
16	72131601-006	Aislacion de muro en union de techos/canaletas con parapetos con impactl y tramafix	Metros cuadrados	27,6	124.880	3.446.688	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
17	72131601-008	Reconstrucción de Revoque exterior fachada simil existente, incluye la reconstrucción de buñas y salpicado	Metros cuadrados	102	104.330	10.641.660	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
18	72131601-005	Restauración y consolidación de molduras y elementos ornamentales en fachada	Metro lineal	34	177.535	6.036.190	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
19	72131601-005	Cerramiento necesario con pared de 0,15 en sector de puerta y ventana a demoler	Unidad Medida Global	1	564.525	564.525	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
20	72131601-008	Revoque interior simil existente	Metros cuadrados	95	57.355	5.448.725	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
21	72131601-008	Revoque exterior simil existente	Metros cuadrados	62	62.490	3.874.380	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
22	72131601-010	ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P1. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc.	Metros cuadrados	4,6	830.000	3.818.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
23	72131601-010	ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P2. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc.	Metros cuadrados	2	830.000	1.660.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
24	72131601-010	ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P3. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc.	Metros cuadrados	3,5	830.000	2.905.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
25	72131601-010	Ventana corrediza con vidrio templado y perfileria de aluminio anodizado 0,90 x 1,20 m	Metros cuadrados	1,08	1.175.350	1.269.378	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samuel
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01				EJECUTADO						PORCENTAJE %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
26	72131601-010	Abertura: puerta de vidrio templado y perfilería de aluminio anodizado 1,00 x 2,1 m según planos y Especificaciones Técnicas, con freno hidráulico	Unidad	1	3.553.000	3.553.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
27	72131601-009	Reconstrucción de los pisos y zocalos de layota nacional, en los sitios afectados y sectores dañados de la Sala de lectura, con piezas idénticas a las existentes. Inclye preparación de base, provisión, colocación, terminaciones	Metros cuadrados	20	175.315	3.506.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
28	72131601-009	Contrapiso y piso cerámico tipo layota nacional idem existente al piso en sala de lectura (incluye zócalos)	Metros cuadrados	31	175.315	5.434.765	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
29	72101601-001	Cubierta nueva. Restauración para su reutilización del maderamen existente; Introducción de nuevos componentes (tirantes, contravigas y refuerzos que sean necesarios, de madera, hierro u otros); cubierta de chapa metálica termoacustica con alma de isopor 5 mm	Metros cuadrados	70	432.630	30.284.100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
30	72101601-001	Reparación de cubierta de tejas españolas	Metros cuadrados	33	79.115	2.610.795	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
31	72102201-002	Tablero general. Incluye Provisión, colocación y conexión de todos los componentes	Unidad Medida Global	1	3.285.000	3.285.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
32	72102201-002	Bocas de Luces y Ventiladores de techo (por bocas)	Unidad	33	158.900	5.243.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
33	72102201-002	Tomas (por bocas)	Unidad	12	158.900	1.906.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
34	72101903-001	Adecuación de estructura metálica, soporte de guías de luminaria, incluyendo refuerzo estructural del soporte, para su reutilización en la sala de lectura	Unidad Medida Global	1	1.986.000	1.986.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
35	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interiores del tipo fluorescentes 2 tubos LED 18 W	Unidad	14	177.800	2.489.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
36	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación exteriores adosado a la pared con lamparas led 15 w. Sector patio	Unidad	6	159.100	954.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
37	72102201-9998	Provisión, colocación e instalación de artefactos de iluminación exteriores. Proyector led 30 W Sector fachada	Unidad	10	206.000	2.060.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
38	72102201-9997	Desmonte y recolocacion de ventiladores de techo existentes	Unidad	3	236.000	708.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
39	72101510-005	Sector sala de Lectura - Canaleta embutida; según planos y Especificaciones Técnicas	Metro lineal	17	236.460	4.019.820	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
40	72101510-005	Sector sala de Lectura - Caños de bajada de 100mm	Metro lineal	9	133.350	1.200.150	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
41	72101510-005	Sector sala de Lectura - Registros de 50x50, con tapa bandeja revestida c/piso	Unidad	2	391.060	782.120	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01				EJECUTADO						PORCENTAJE %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
42	72101510-005	Sector sala de Lectura - Caños de PVC 100mm enterrados, salida a la calle, incluye arreglo de vereda por colocacion de caños	Metro lineal	8	135.180	1.081.440	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
43	72101510-005	Sector sala de Lectura - Ducto de mampostería, incluye revoque c/aislación	Metros cuadrados	4,8	269.900	1.295.520	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
44	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Canaleta de borde	Metro lineal	7	165.380	1.157.660	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
45	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Caño de bajada de PVC 100	Metro lineal	3	133.350	400.050	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
46	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Registros 30 x 30 cm tapa de rejilla metálica	Unidad	1	315.600	315.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
47	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Caños de PVC 100mm enterrados, salida a la calle, incluye arreglo de vereda por colocacion de caños	Metro lineal	4	135.180	540.720	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
48	72131601-012	Pintura de paredes a la cal con fijador interior/exterior	Metros cuadrados	230	22.390	5.149.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
49	72131601-012	Pintura de paredes al latex interior/exterior	Metros cuadrados	125	33.230	4.153.750	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
50	72131601-012	Pintura sintetica satinol de aberturas de madera	Metros cuadrados	149	49.960	7.444.040	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
51	72131601-012	Pintura al sintético, satinado, color a definir, en rejas y porton	Metros cuadrados	42	37.880	1.590.960	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
52	72131601-012	Pintura sintetica de estructura de techo (satinol)	Metros cuadrados	60	37.880	2.272.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
53	72131601-012	Pintura sintetica (satinol) de techo	Metros cuadrados	33	43.040	1.420.320	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
54	72131601-012	Pintura al sintetico satinado de canaletas y caños de bajada	Metro lineal	27	35.170	949.590	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
55	72131601-012	Pintura impermeabilizante en paredes exteriores internas de parapetos	Metro lineal	45	70.320	3.164.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
56	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	1,75	456.170	798.298	0,00	1,75	1,75	0	798.298	798.298	100,00%
57	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1,85	190.000	351.500	0,00	1,85	1,85	0	351.500	351.500	100,00%
58	72131601-006	Aislación Horizontal de muros 0,39 m - 3 caras	Metro lineal	8,05	44.670	359.594	0,00	8,05	8,05	0	359.594	359.594	100,00%
59	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	21	113.400	2.381.400	0,00	18,00	18,00	0	2.041.200	2.041.200	85,71%
60	72131601-005	Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marcos	Metro lineal	8,05	32.500	261.625	0,00	8,05	8,05	0	261.625	261.625	100,00%
61	72131601-008	Revoque interior y exterior 1:4:16 con hidrofugo	Metros cuadrados	42	40.230	1.689.660	0,00	18,00	18,00	0	724.140	724.140	42,86%
62	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min)	Metros cuadrados	10	35.360	353.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
63	72131601-009	Carpeta de cemento alisado para piso ceramico	Metros cuadrados	10	37.680	376.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
64	72131601-009	Piso cerámico de alto transito PI4 30 x 30 blanco	Metros cuadrados	7	120.260	841.820	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
65	72131601-009	Piso de cemento alisado con endurecedor superficial	Metros cuadrados	3	76.760	230.280	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
66	72102508-003	Revestimiento con azulejos 15x15cm calor blanco h=2,10m	Metros cuadrados	7,5	113.110	848.325	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01				EJECUTADO						PORCENTAJE %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
67	72131601-007	Techo de chapas onduladas zincalum N° 27 con estructura metalica	Metros cuadrados	7	202.390	1.416.730	0,00	7,00	7,00	0	1.416.730	1.416.730	100,00%
68	72101601-002	Cielorraso de placas de yeso tipo durlock c/junta tomada	Metros cuadrados	7	177.190	1.240.330	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
69	72102508-003	Azulejo 20 x 30 calor blanco h=2,10m	Metros cuadrados	19,5	115.350	2.249.325	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
70	72131601-012	Pintura: exterior Latex color a definir	Metros cuadrados	16	49.340	789.440	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
71	72131601-012	Pintura: interior Latex color blanco	Metros cuadrados	3,5	49.340	172.690	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
72	72131601-012	Pintura: de cielorraso Latex color blanco con enduido	Metros cuadrados	7	53.330	373.310	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
73	72131601-012	Pintura: de canaleta de bajada c/ sintetico color grafito claro	Metro lineal	3,5	35.690	124.915	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
74	72131601-012	Pintura: de marco y puerta placa con esmalte sintetico color beige	Metros cuadrados	5,5	48.840	268.620	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
75	72101510-005	Desague pluvial: canaleta embutida y de bajada, Chapa N° 24, desarrollo 0,80 m	Metro lineal	7	203.240	1.422.680	0,00	7,00	7,00	0	1.422.680	1.422.680	100,00%
76	72101510-007	Desague cloacal interior Baño	Unidad Medida Global	1	693.540	693.540	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
77	72101510-007	Desague cloacal exterior: C.I., C. Séptica, Pozo Ciego, Cañerías	Unidad Medida Global	1	3.955.000	3.955.000	0,00	0,90	0,90	0	3.559.500	3.559.500	90,00%
78	72131601-011	Agua corriente agua fría interior y exterior en baño	Unidad Medida Global	1	734.570	734.570	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
79	72101510-9998	- Inodoro con cisterna baja color blanco con tapa de plastico acolchada	Unidad	1	1.130.000	1.130.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
80	72101510-9998	- Lavatorio mediano de colgar color blanco (sin pedestal)	Unidad	1	594.870	594.870	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
81	72101510-9998	- Espejos en baños 0,40 m x 0, 60 m	Unidad	1	259.130	259.130	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
82	72101510-9998	- Dispensadores: 1 de Jabon Liquido, 1 de toalla de papel, 1 de rollo de papel y 1 percha simple de acero inox	Unidad Medida Global	1	831.610	831.610	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
83	72101510-9998	- Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo y una barra de asimiento rebatible)	Unidad Medida Global	1	1.730.000	1.730.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
84	72101510-9998	- Canilla cromada para lavatorio pico alto 1/2"	Unidad	1	197.750	197.750	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
85	72101510-9998	- Canilla cromada para patio con pico manguera	Unidad	1	171.490	171.490	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
86	72102201-002	Instalación Electrica: Cableado, llaves y tomas Interior baño (por bocas)	Unidad	3	171.100	513.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
87	72102201-002	Instalación Luminarias: Spot simples embutidos c/lámparas a rosca LED 15 w Interior Baño	Unidad	2	173.000	346.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
88	72102601-001	Carpinteria de madera: Puerta Placa 1,00X2,10m com marco de 0,15, contramarco, herrajes y cerradura para interior	Unidad	1	1.330.000	1.330.000	0,00	1,00	1,00	0	1.330.000	1.330.000	100,00%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Sumudio
Dirección de Proyectos y Obras
DPTO / SNC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01				EJECUTADO						PORCENTAJE %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
89	72101903-001	Carpinteria metalica: Ventana Pivotante 0,60 x 0,45 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio templado traslucido	Unidad	1	540.000	540.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
90	72101903-001	Carpinteria metalica: Ventana Fija 1,00 x 0,50 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio templado traslucido	Unidad	1	626.000	626.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
91	72131601-013	Limpieza y Retiro de escombros durante los trabajos	Unidad Medida Global	1	2.765.500	2.765.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
92	72131601-013	Limpieza final de obra (incluye retiro de yuyos en piso alisado de cemento del patio)	Unidad Medida Global	1	1.245.000	1.245.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
		CONVENIO MODIFICATORIO N° 01											
1		Canaleta de borde en techo Planta Alta contiguo a Sala de Lectura	Metro lineal	12	165.380	1.984.560	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2		Caños de bajada de PVC 100 en techo Planta Alta contiguo a la Sala de Lectura	Metro lineal	14	133.350	1.866.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3		Aislación de techo con membrana asfaltica 3mm con aluminio en sector posterior a Sala de Lectura	Metros cuadrados	42	117.000	4.914.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4		Provisión y colocación de viga metálica en techo Sector sala posterior a Sala de Lectura Long=6,50 m	Unidad Medida Global	1	6.465.000	6.465.000	0,00	1,00	1,00	0	6.465.000	6.465.000	100,00%
5		Desmonte, adaptación y recolocación de piso de madera existente en Sector a apuntalar	Metros cuadrados	12	84.000	1.041.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6		Desmonte y recolocación de Cielorraso de madera terciada existente en Sector a apuntalar	Metros cuadrados	19	70.650	1.324.688	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
					Precio Total	272.807.670			Total Certificado		37.290.722	37.290.722	**13,67%**
					Anticipo	51.042.184			Descuento Anticipo 20%		7.458.144	7.458.144	14,61%
									Saldo a Cobrar		**29.832.578**	29.832.578	

Son Guaranies: Veinte y nueve millones ochocientos treinta y dos mil quinientos setenta y ocho.-

REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Ing. Mario Raul Ibarrola Adono
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2023 "Puesta en Valor de las Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con ID: 430902, CONTRATO N° 01/2023

CURVA DE INVERSION - Periodo: AGOSTO 2023

MONTO CONTRATO + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 Gs:	272.807.670

		Inicio	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias
PROYECTADO	Porcentaje %	0,00	7,78%	29,48%	60,92%	89,49%	100,00%
	Valores Gs.	0	21.224.437	80.423.701	272.807.671	244.135.584	272.807.670
EJECUTADO	Porcentaje %	0,00	13,67%				
	Valores Gs.	0	37.290.722				

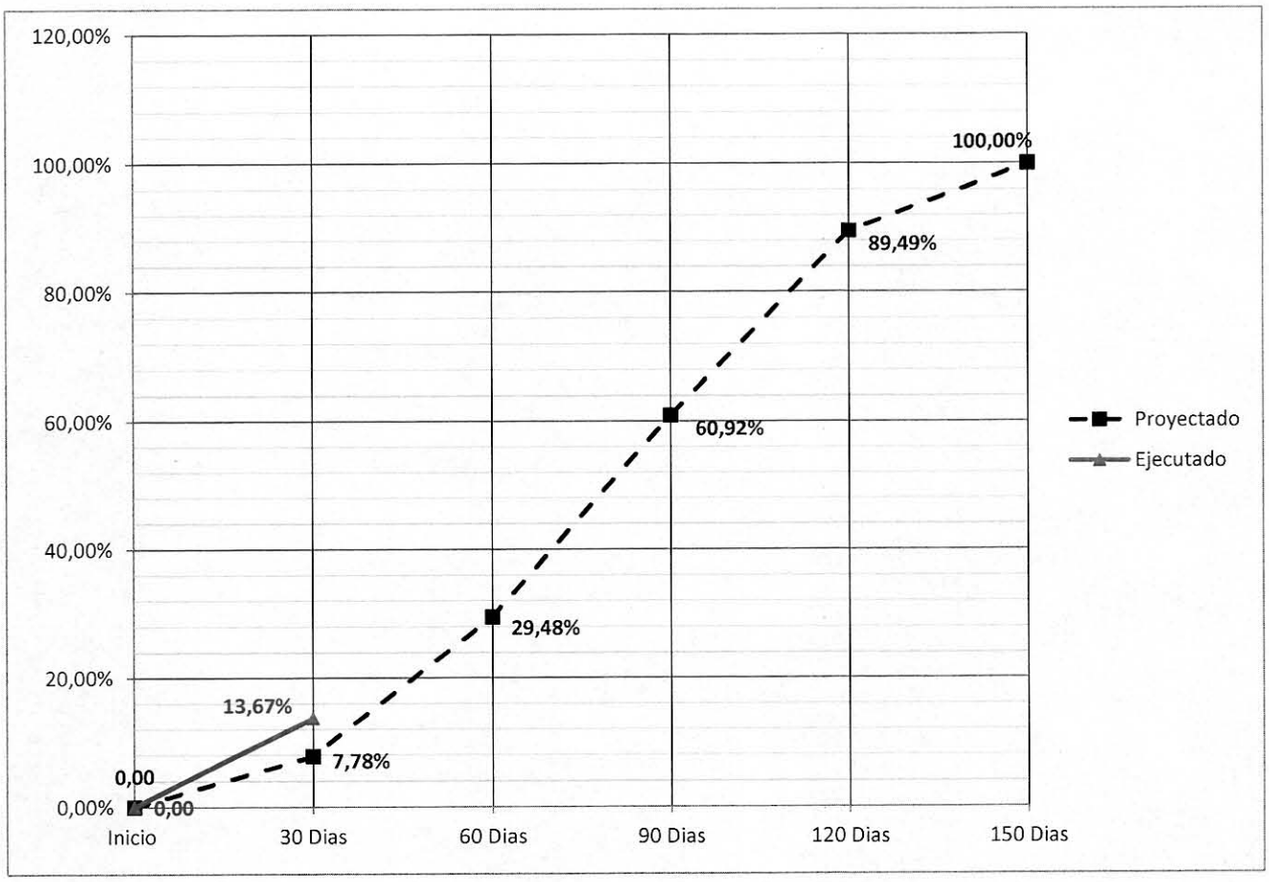

CONTRATISTA
Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRA
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2023 "Puesta en Valor de las Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con ID: 430902, CONTRATO N° 01/2023

ACTA DE MEDICION N° 01 **PERIODO: AGOSTO 2023**

LOTE NRO: 1 - PILAR

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CANTIDAD CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01		CANTIDAD EJECUTADA			PORCENTAJE %
			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
		CONTRATO ORIGINAL						
1	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra 0,80 x 1,20 m	Unidad	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
2	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos con madera terciada en Sala de lectura	Metros cuadrados	60	0,00	60,00	60,00	100,00%
3	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS: Fumigación contra termitas	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	72153901-001	APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN. Apuntalamiento y contención (permanente) del SECTOR C indicado en los planos de intervención. Incluye Diseño, Dimensionamiento, Provisión y colocación según Especificaciones Técnicas.(superficie medible en planta, tener en cuenta que incluye de piso a techo)	Metros cuadrados	75	0,00	7,50	7,50	10,00%
5	72101603-9999	Desmonte de cubierta y todos sus componentes com recuperación, en el sector de la sala de lectura. Incluye desmonte de canaletas.	Metros cuadrados	67	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	72101601-002	Desmonte de Cielorraso existente en Sala de Lectura	Metros cuadrados	67	0,00	67,00	67,00	100,00%
7	72131601-008	Retiro de revoque deteriorado y/o incompatible con el soporte.	Metros cuadrados	240	0,00	36,00	36,00	15,00%
8	72103003-001	Demolición de piso cerámico en sector posterior a Sala de Lectura Biblioteca (pieza donde está el baño actual a demoler)	Metros cuadrados	31	0,00	31,00	31,00	100,00%
9	72103003-001	Demolicion de puerta y ventana existente en sector posterior a Sala de lectura	Unidad Medida Global	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
10	72103003-001	Demolición de baño existente, incluye el desmonte de todos los componentes.	Unidad Medida Global	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
11	70111503-002	Desmonte de arbol existente en sector de construccion del baño (incluye desmontar la raiz)	Unidad Medida Global	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
12	72131601-003	CONSOLIDACION DE CIMIENTO. Submuración de muro en Sala de Lectura según especificaciones técnicas.	Metro lineal	12	0,00	6,00	6,00	50,00%
13	72101703-011	Restauración de lesiones en el soporte murario según modalidades de intervención. Incluye todos los trabajos complementarios necesarios.	Metros cuadrados	60	0,00	15,00	15,00	25,00%
14	72131601-006	Aislacion horizontal de muro (sector de submuración)	Metro lineal	12	0,00	6,00	6,00	50,00%
15	72131601-006	Aislaciones en superficie de fachada (en molduras de fachada)	Metro lineal	34	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	72131601-006	Aislacion de muro en union de techos/canaletas con parapetos con impactl y tramafix	Metros cuadrados	27,6	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	72131601-008	Reconstrucción de Revoque exterior fachada simil existente, incluye la reconstrucción de buñas y salpicado	Metros cuadrados	102	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	72131601-005	Restauración y consolidación de molduras y elementos ornamentales en fachada	Metro lineal	34	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	72131601-005	Cerramiento necesario con pared de 0,15 en sector de puerta y ventana a demoler	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	72131601-008	Revoque interior simil existente	Metros cuadrados	95	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	72131601-008	Revoque exterior simil existente	Metros cuadrados	62	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	72131601-010	ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P1. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc.	Metros cuadrados	4,6	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	72131601-010	ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P2. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc.	Metros cuadrados	2	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	72131601-010	ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P3. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc.	Metros cuadrados	3,5	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
25	72131601-010	Ventana corrediza con vidrio templado y perfileria de aluminio anodizado 0,90 x 1,20 m	Metros cuadrados	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	72131601-010	Abertura: puerta de vidrio templado y perfilería de aluminio anodizado 1,00 x 2,1 m según planos y Especificaciones Técnicas, con freno hidráulico	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	72131601-009	Reconstrucción de los pisos y zocalos de layota nacional, en los sitios afectados y sectores dañados de la Sala de lectura, con piezas idénticas a las existentes. Inclye preparación de base, provisión, colocación, terminaciones	Metros cuadrados	20	0,00	0,00	0,00	0,00%
28	72131601-009	Contrapiso y piso cerámico tipo layota nacional idem existente al piso en sala de lectura (incluye zócalos)	Metros cuadrados	31	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	72101601-001	Cubierta nueva. Restauración para su reutilización del maderamen existente; Introducción de nuevos componentes (tirantes, contravigas y refuerzos que sean necesarios, de madera, hierro u otros); cubierta de chapa metálica termoacustica con alma de isopor 5 mm	Metros cuadrados	70	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	72101601-001	Reparación de cubierta de tejas españolas	Metros cuadrados	33	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	72102201-002	Tablero general. Incluye Provisión, colocación y conexión de todos los componentes	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	72102201-002	Bocas de Luces y Ventiladores de techo (por bocas)	Unidad	33	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	72102201-002	Tomas (por bocas)	Unidad	12	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	72101903-001	Adecuación de estructura metálica, soporte de guías de luminaria, incluyendo refuerzo estructural del soporte, para su reutilización en la sala de lectura	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interiores del tipo fluorescentes 2 tubos LED 18 W	Unidad	14	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación exteriores adosado a la pared con lamparas led 15 w. Sector patio	Unidad	6	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	72102201-9998	Provisión, colocación e instalación de artefactos de iluminación exteriores. Proyector led 30 W Sector fachada	Unidad	10	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	72102201-9997	Desmonte y recolocacion de ventiladores de techo existentes	Unidad	3	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	72101510-005	Sector sala de Lectura - Canaleta embutida; según planos y Especificaciones Técnicas	Metro lineal	17	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	72101510-005	Sector sala de Lectura - Caños de bajada de 100mm	Metro lineal	9	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	72101510-005	Sector sala de Lectura - Registros de 50x50, con tapa bandeja revestida c/piso	Unidad	2	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	72101510-005	Sector sala de Lectura - Caños de PVC 100mm enterrados, salida a la calle, incluye arreglo de vereda por colocacion de caños	Metro lineal	8	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	72101510-005	Sector sala de Lectura - Ducto de mampostería, incluye revoque c/aislación	Metros cuadrados	4,8	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Canaleta de borde	Metro lineal	7	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Caño de bajada de PVC 100	Metro lineal	3	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Registros 30 x 30 cm tapa de rejilla metálica	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
47	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Caños de PVC 100mm enterrados, salida a la calle, incluye arreglo de vereda por colocacion de caños	Metro lineal	4	0,00	0,00	0,00	0,00%
48	72131601-012	Pintura de paredes a la cal con fijador interior/exterior	Metros cuadrados	230	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	72131601-012	Pintura de paredes al latex interior/exterior	Metros cuadrados	125	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	72131601-012	Pintura sintetica satinol de aberturas de madera	Metros cuadrados	149	0,00	0,00	0,00	0,00%
51	72131601-012	Pintura al sintético, satinado, color a definir, en rejas y porton	Metros cuadrados	42	0,00	0,00	0,00	0,00%
52	72131601-012	Pintura sintetica de estructura de techo (satinol)	Metros cuadrados	60	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	72131601-012	Pintura sintetica (satinol) de techo	Metros cuadrados	33	0,00	0,00	0,00	0,00%
54	72131601-012	Pintura al sintetico satinado de canaletas y caños de bajada	Metro lineal	27	0,00	0,00	0,00	0,00%
55	72131601-012	Pintura impermeabilizante en paredes exteriores internas de parapetos	Metro lineal	45	0,00	0,00	0,00	0,00%
56	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	1,75	0,00	1,75	1,75	100,00%
57	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1,85	0,00	1,85	1,85	100,00%
58	72131601-006	Aislación Horizontal de muros 0,39 m - 3 caras	Metro lineal	8,05	0,00	8,05	8,05	100,00%
59	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	21	0,00	18,00	18,00	85,71%
60	72131601-005	Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marcos	Metro lineal	8,05	0,00	8,05	8,05	100,00%
61	72131601-008	Revoque interior y exterior 1:4:16 con hidrofugo	Metros cuadrados	42	0,00	18,00	18,00	42,86%
62	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min)	Metros cuadrados	10	0,00	0,00	0,00	0,00%
63	72131601-009	Carpeta de cemento alisado para piso ceramico	Metros cuadrados	10	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ing. Mario E. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
64	72131601-009	Piso cerámico de alto transito PI4 30 x 30 blanco	Metros cuadrados	7	0,00	0,00	0,00	0,00%
65	72131601-009	Piso de cemento alisado con endurecedor superficial	Metros cuadrados	3	0,00	0,00	0,00	0,00%
66	72102508-003	Revestimiento con azulejos 15x15cm calor blanco h=2,10m	Metros cuadrados	7,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
67	72131601-007	Techo de chapas onduladas zincalum N° 27 con estructura metalica	Metros cuadrados	7	0,00	7,00	7,00	100,00%
68	72101601-002	Cielorraso de placas de yeso tipo durlock c/junta tomada	Metros cuadrados	7	0,00	0,00	0,00	0,00%
69	72102508-003	Azulejo 20 x 30 calor blanco h=2,10m	Metros cuadrados	19,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
70	72131601-012	Pintura: exterior Latex color a definir	Metros cuadrados	16	0,00	0,00	0,00	0,00%
71	72131601-012	Pintura: interior Latex color blanco	Metros cuadrados	3,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
72	72131601-012	Pintura: de cielorraso Latex color blanco con enduido	Metros cuadrados	7	0,00	0,00	0,00	0,00%
73	72131601-012	Pintura: de canaleta de bajada c/ sintetico color grafito claro	Metro lineal	3,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
74	72131601-012	Pintura: de marco y puerta placa con esmalte sintetico color beige	Metros cuadrados	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	72101510-005	Desague pluvial: canaleta embutida y de bajada, Chapa N° 24, desarrollo 0,80 m	Metro lineal	7	0,00	7,00	7,00	100,00%
76	72101510-007	Desague cloacal interior Baño	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
77	72101510-007	Desague cloacal exterior: C.I., C. Séptica, Pozo Ciego, Cañerías	Unidad Medida Global	1	0,00	0,90	0,90	90,00%
78	72131601-011	Agua corriente agua fría interior y exterior en baño	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
79	72101510-9998	- Inodoro con cisterna baja color blanco con tapa de plastico acolchada	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
80	72101510-9998	- Lavatorio mediano de colgar color blanco (sin pedestal)	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
81	72101510-9998	- Espejos en baños 0,40 m x 0, 60 m	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
82	72101510-9998	- Dispensadores: 1 de Jabon Liquido, 1 de toalla de papel, 1 de rollo de papel y 1 percha simple de acero inox	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
83	72101510-9998	- Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo y una barra de asimiento rebatible)	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
84	72101510-9998	- Canilla cromada para lavatorio pico alto 1/2"	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
85	72101510-9998	- Canilla cromada para patio con pico manguera	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
86	72102201-002	Instalación Electrica: Cableado, llaves y tomas Interior baño (por bocas)	Unidad	3	0,00	0,00	0,00	0,00%
87	72102201-002	Instalación Luminarias: Spot simples embutidos c/lámparas a rosca LED 15 w Interior Baño	Unidad	2	0,00	0,00	0,00	0,00%
88	72102601-001	Carpinteria de madera: Puerta Placa 1,00X2,10m com marco de 0,15, contramarco, herrajes y cerradura para interior	Unidad	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
89	72101903-001	Carpinteria metalica: Ventana Pivotante 0,60 x 0,45 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio templado traslucido	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
90	72101903-001	Carpinteria metalica: Ventana Fija 1,00 x 0,50 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio templado traslucido	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
91	72131601-013	Limpieza y Retiro de escombros durante los trabajos	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
92	72131601-013	Limpieza final de obra (incluye retiro de yuyos en piso alisado de cemento del patio)	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
		CONVENIO MODIFICATORIO N° 01						
	1	Canaleta de borde en techo Planta Alta contiguo a Sala de Lectura	Metro lineal	12	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Caños de bajada de PVC 100 en techo Planta Alta contiguo a la Sala de Lectura	Metro lineal	14	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3	Aislación de techo con membrana asfaltica 3mm con aluminio en sector posterior a Sala de Lectura	Metros cuadrados	42	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4	Provisión y colocación de viga metálica en techo Sector sala posterior a Sala de Lectura Long=6,50 m	Unidad Medida Global	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
	5	Desmonte, adaptación y recolocación de piso de madera existente en Sector a apuntalar	Metros cuadrados	12	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6	Desmonte y recolocación de Cielorraso de madera terciada existente en Sector a apuntalar	Metros cuadrados	19	0,00	0,00	0,00	0,00%

REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Ing. Mario Raul Ibarrola Adono
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Lote 5666772676 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270160743570

FECHA 24/08/2023

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	430285	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	IBARROLA ADORNO MARIO RAUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 23/09/2023

NÚMERO DE CONTROL : 9F27095B

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

42714302859F27095B

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 430285 Control: 8bb10833 Fecha: 17/08/2023 11:23 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACION

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4
V.4 Enero/2020

120

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB — LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS

Número de Orden	12064161789	RUC	430285 — DV 0
Razón Social/Primer Apellido	IBARROLA	Segundo Apellido	ADORNO
Nombres	MARIO RAUL		

01	Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
02	Declaración Jurada Rectificativa	03	0
05	Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 0 7 — Año: 2 0 2 3

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-	IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	637.646.744			22	63.764.674
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	0				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	0			23	0
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	637.646.744	21	0	24	63.764.674

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0
g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	0

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE AL 5% -I-		MONTO IMPONIBLE AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-	
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	465.400	35	236.612.988	38	23.684.569
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)					165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	0	42	0
f	**TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	23.684.569

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	63.764.674
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	23.684.569
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	0
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	0
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	0
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	40.080.105
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	40.080.105

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		MONTO A FAVOR DEL FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	40.080.105
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	733.499.469		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	29.171.481		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	762.670.950	57	40.080.105
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	722.590.845		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	0		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe

en su carácter de | con Documento No.

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

Ing. Mar R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Busqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contrasena | Salir

Gustavo Bernardo Lopez Gonzalez [2300073-430285] - Proveedor

Formulario de Identificación del Personal

En esta sección podrá administrar los Formularios de Identificación del Personal del contrato según lo establecido en el Decreto 6121/2016

ID Llamado: 430902

Llamado: Puesta en Valor de las Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Nombre	Apellido	Documento	Estado	Acción
NICOLAS	GONZALEZ GALEANO	937306	Activo	
SIMONA	LOPEZ SILVA	1857999	Activo	
Lidia Elizabeth	Bareiro Duarte	4492994	Activo	
CESAR ABRAHAM	CENTURION ENRIQUEZ	5103869	Activo	
Ruben Antonio	Duarte Martinez	1436444	Activo	
Gustavo Bernardo	Lopez Gonzalez	2300073	Activo	

Nuevo Formulario de Identificación del Personal

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes | Mesa de Ayuda y Sugerencias

GOBIERNO NACIONAL

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

RUC

430285-0

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 430902 / Puesta en Valor de las Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Monto del contrato

255.210.922

Año: 2023 **Periodo:** Julio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	NICOLAS	GONZALEZ GALEANO	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
2	SIMONA	LOPEZ SILVA	Cumplio	2680373	Contratista	Activo
3	Lidia Elizabeth	Bareiro Duarte	Cumplio	3000000	Contratista	Activo
4	CESAR ABRAHAM	CENTURION ENRIQUEZ	Cumplio	2680373	Contratista	Activo
5	Ruben Antonio	Duarte Martinez	Cumplio	4500000	Contratista	Activo
6	Gustavo Bernardo	Lopez Gonzalez	Cumplio	3200000	Contratista	Activo

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Usuario Impresión: 2300073-430285

Fecha Impresión: 23/08/2023

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 430285

NRO. CERTIFICADO: 398023

FECHA EMISION: 23-08-2023

VENCIMIENTO: 20-09-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 430285

Nro. Certificado: 398023

Razon Social: IBARROLA ADORNO MARIO RAUL

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 25-07-1997

Cantidad de Asegurados: 6

Nro. Patronal(es): 0004-40-0356 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
