Metalúrgica Nuñez

de Rubén Nuñez Esquivel

Fabrica de Tinglados, Portones, Rejas
Soldaduras en Gral.

Calle Venezuela a 70m de la Avda Japón Cel. 0985/702576 Pirapó Centro

00039484

Bella Vista, 10 de Febrero de 2021

Señor:
Francisco Pereira
Intendente
Municipalidad de Cambyreta

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de solicitar el desembolso de (Gs.31.982.822) GUARANIES TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL, según Adjudicación del llamado CO-08-2020 TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIA DE LA ESCUELA BASICA N°731 SAN MIGUEL," correspondiente al CERTIFICADO Nº 1, según contrato N° 01/2021.-

Sin otro particular me despido reiterando mis cordiales saludos, y en espera de una respuesta favorable.

Adjunto:

Certificado, Factura, CCT.

Rubén Núñez
2.172.215
CONTRATISTA

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaria general hoy 10
de Febrero de 2021
siendo las 08 horas 13
Secretaria General
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

ACTA DE MEDICIÓN N° 1

OBRA: TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍA DE LA ESCUELA BÁSICA N° 731 SAN MIGUEL. CON ID: 385640. CONTRATO N° 01/2021.-

CONTRATISTA: Rubén Darío Núñez Esquivel.

En el distrito de Cambyretá, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los diez días del mes de Febrero del 2021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el Arq. Luis Roa, como Fiscal de Obras y el Sr. Rubén Darío Núñez Esquivel, representante de la firma unipersonal Metalúrgica Núñez, como Contratista de la Obra "TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍA DE LA ESCUELA BÁSICA N° 731 SAN MIGUEL. CON ID: 385640. CONTRATO N° 01/2021.".

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismos han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados. En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a los establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del certificado N° 1.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Rubén Darío Núñez Esquivel	**Arq. Luis Roa**
Contratista	**Fiscal de Obras**
Metalúrgica Núñez	**Municipalidad de Cambyretá**

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
0985 - 702 572 - Pirapó

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Concurso de Ofertas N° 08/2020 "TECHADO PARA CANCHA Y COSNTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N°731 SAN MIGUEL". ID N° 385.640

Contrato N° 01/2021

Certificado n°1

CONTRATISTA	METALURGICA NUNEZ
FECHA DE PRESENTACIÓN	11/02/2021
FECHA DE INICIO	05/01/2021
PLAZO INICIAL	180 días
PLAZO DE ADENDA	———
DIAS DE LLUVIA	15 días
PLAZO PRORROGADO	195 días
DIAS TRANSCURRIDOS	38
RECEPCIÓN PROVISORIA	———

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**PREPARACIÓN DE OBRA**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**1.148.318**				0	**1.103.930**	1.103.930	***70%***
1.1	Limpieza, preparación del terreno y replanteo	Metros cuadrados	81,00	4.320	349.920	0,00	81,00	81,00	0	349.920	349.920	100%
1.2	Cartel de obra (2.50x1.50m)	Unidad	1,00	749.078	749.078	0,00	1,00	1,00	0	749.078	749.078	100%
1.3	Demolición de muro de 0,30	Metros cuadrados	4,50	10.960	49.320	0,00	0,45	0,45	0	4.932	4.932	10%
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**4.632.988**				0	**1.113.826**	1.113.826	***20%***
2.1	Excavación para cimiento PBC, incluye área de escenario	Metros cúbicos	53,40	35.574	1.899.652	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
2.2	Excavación para zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	59,00	31.464	1.856.376	0,00	35,40	35,40	0	1.113.826	1.113.826	60%
2.3	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en ampliación de escenario y rampa.	Metros cúbicos	14,00	62.640	876.960	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
3	**FUNDACIÓN**	**Metros cúbicos**	**19,65**		**6.229.305**				0	**0**	0	***0%***
3.1	Cimiento PBC con cal, 0,40 mx 0,50 m	Metros cúbicos	19,65	317.013	6.229.305	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
4	**ESTRUCTURA DE H°A°**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**75.678.193**				0	**31.448.373**	31.448.373	***34%***
4.1	Zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	7,70	1.329.334	10.235.872	0,00	4,62	4,62	0	6.141.523	6.141.523	60%
4.2	Encadenado inferior y superior de Hº Aº de 15 x 20 cm. en escenario	Metro lineal	49,60	90.893	4.508.293	0,00	24,80	24,80	0	2.254.146	2.254.146	50%
4.3	Viga de encadenado inferior de H° A° de 20 x 30 cm	Metros cúbicos	4,40	1.536.000	6.758.400	0,00	2,64	2,64	0	4.055.040	4.055.040	60%
4.4	Viga de encadenado intermedio y superior de H° A° de 20 x 40 cm	Metros cúbicos	11,75	1.534.080	18.025.440	0,00	5,88	5,88	0	9.012.720	9.012.720	50%
4.5	Columna H°A° (Incluye tronco).	Metros cúbicos	12,30	1.623.568	19.969.886	0,00	6,15	6,15	0	9.984.943	9.984.943	50%
4.6	Columna H°A° en escenario de 40 x20 cm	Metros cúbicos	1,12	1.623.568	1.818.396	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
4.7	Columna de H°A° en escenario de 18 x 20 cm	Metros cúbicos	0,36	1.625.600	585.216	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
4.8	Losa de H° A°espesor 0,10 para gradería	Metros cúbicos	8,50	1.620.787	13.776.690	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
5	**MURO DE NIVELACIÓN**	**Metros cuadrados**	**11,00**		**1.394.624**				0	**0**	0	***0%***
5.1	De 0,30 cm, ladrillos común en escenario y gradería	Metros cuadrados	11,00	126.784	1.394.624	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
6	**AISLACION HIDROFUGA**	**Metro lineal**	**62,00**		**1.627.500**				0	**0**	0	***0%***
6.1	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida.	Metro lineal	62,00	26.250	1.627.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Dpto. Administrativo de Ofertas y Contratos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**30.829.351**				0	**0**	0	**0%**
7.1	Elevación de 0,15 con ladrillo hueco revocado interior.	Metros cuadrados	401,00	68.878	27.620.078	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
7.2	Elevación de 0,15 con ladrillo convoco	Metros cuadrados	8,40	101.532	852.869	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
7.3	Mamposteria de 0,30 de ladrillo común. (Incluye gradas)	Metros cuadrados	17,00	138.612	2.356.404	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
8	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**11.151.774**				0	**0**	0	**0%**
8.1	Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratachado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos huecos	Metros cuadrados	416,00	24.977	10.390.432	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
8.2	Revoque de vigas y columnas. Incluye revoque de adherencia	Metros cuadrados	16,38	46.480	761.342	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
9	**TECHO**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**207.228.406**				0	**0**	0	**0%**
9.1	Techo de chapas sobre perfiles C con membrana aislante de 5mm; según especificaciones.	Metros cuadrados	872,00	159.451	139.041.272	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
9.2	Estructura metálica: cabriadas de perfilería metálica, según especificaciones y detalles.	Unidad	7,00	-	64.605.394	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
9.3	Cabriadas de perfiles metálicos en escenario, según especificaciones. (Precio referenciado a item 9.2)	Metro lineal	10,00	358.174	3.581.740	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
10	**CIELORRASO**	**Metros cuadrados**	**77,00**		**6.800.640**				0	**0**	0	**0%**
10.1	Cielorraso de machimbre de PVC, color blanco	Metros cuadrados	77,00	88.320	6.800.640	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
11	**CONTRAPISO Y CARPETAS**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**6.061.950**				0	**0**	0	**0%**
11.1	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm. Incluye rampa de acceso.	Metros cuadrados	125,00	32.490	4.061.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
11.2	Carpeta para pisos cerámicos	Metros cuadrados	100,00	20.007	2.000.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
12	**PISO**	**Metros cuadrados**	**25,00**		**1.457.625**				0	**0**	0	**0%**
12.1	Piso calcareo de reposición	Metros cuadrados	25,00	58.305	1.457.625	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
13	**DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**10.039.580**				0	**0**	0	**0%**
13.1	Registro de desagüe boca abierta 60 x 60 cm con rejilla	Unidad Medida Global	7,00	337.139	2.359.973	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
13.2	Desagüe pluvial caño 100, calce y colchón de arena	Metro lineal	65,00	37.242	2.420.730	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
13.3	Canal abierto de desague pluvial de 60cm de ancho	Metro lineal	57,00	92.261	5.258.877	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14	**CARPINTERIA METÁLICA**	**Metro lineal**	**1,00**		**38.396.184**				0	**0**	0	**0%**
14.1	Canaleta c/ chapa galvanizada desarrollo 50	Metro lineal	74,10	254.398	18.850.892	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14.2	Bajadas c/chapa galvanizada, desarrollo 50	Metro lineal	52,00	76.864	3.996.928	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14.3	Barandas metálicas en rampa	Metro lineal	11,50	239.503	2.754.285	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14.4	Vallado metálico de 26 m x 4 m (Ver especificaciones)	Unidad	104,00	123.020	12.794.080	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15	**PINTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**13.651.491**				0	**0**	0	**0%**

..URGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Tel: 0985 - 702 572 - Pirapó

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Paraguay

15.1	Pintura látex interior en paredes revocadas, sin enduido	Metros cuadrados	416,00	14.362	5.974.592	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15.2	Pintura de tratamiento de ladrillo visto exterior	Metros cuadrados	315,00	14.006	4.411.890	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15.3	Pintura para barandas metálicas en rampa y escalera.	Metro lineal	11,50	25.811	296.827	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15.4	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	126,00	23.557	2.968.182	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
16	**VARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1,00**		**3.374.816**				0	**0**	0	**0%**
16.1	Placa de bronce embutida en mamposteria. Dimensiones: 25cm x40cm. Letras en relieve	Unidad	1,00	1.162.496	1.162.496	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
16.2	Limpieza final	Unidad	838,00	2.640	2.212.320	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
	TOTAL				**419.702.745**							

Total Certificados	0	33.666.128	33.666.128
Fondo de reparo 5%	0	1.683.306	1.683.306
Neto a cobrar	**0**	**31.982.822**	**31.982.822**

Son Guaranies: Treinta y un millones novecientos ochenta y dos mil ochocientos veintidos.-

Sr. Rubén Darío Núñez Esquivel
Contratista
METALÚRGICA NÚÑEZ

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Concurso de Ofertas N° 08/2020 "TECHADO PARA CANCHA Y COSNTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N°731 SAN MIGUEL". ID N° 385.640
Contrato N° 01/2021
Resumen Certificado n°1

CONTRATISTA	METALÚRGICA NUÑEZ
FECHA DE PRESENTACIÓN	11/02/2021
FECHA DE INICIO	05/01/2021
PLAZO INICIAL	180 días
PLAZO DE ADENDA	———
DIAS DE LLUVIA	15 días
PLAZO PRORROGADO	195 días
DIAS TRANSCURRIDOS	38
RECEPCIÓN PROVISORIA	———

					MONTO (GUARANIES)			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	% de Avance
1	PREPARACIÓN DE OBRA	Unidad Medida Global	1,00	1.148.318	0	1.103.930	1.103.930	*70%*
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1,00	4.632.988	0	1.113.826	1.113.826	*20%*
3	FUNDACIÓN	Metros cúbicos	19,65	6.229.305	0	0	0	*0%*
4	ESTRUCTURA DE H°A°	Unidad Medida Global	1,00	75.678.193	0	31.448.373	31.448.373	*34%*
5	MURO DE NIVELACIÓN	Metros cuadrados	11,00	1.394.624	0	0	0	*0%*
6	AISLACION HIDROFUGA	Metro lineal	62,00	1.627.500	0	0	0	*0%*
7	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN	Unidad Medida Global	1,00	30.829.351	0	0	0	*0%*
8	REVOQUES	Unidad Medida Global	1,00	11.151.774	0	0	0	*0%*
9	TECHO	Unidad Medida Global	1,00	207.228.406	0	0	0	*0%*
10	CIELORRASO	Metros cuadrados	77,00	6.800.640	0	0	0	*0%*
11	CONTRAPISO Y CARPETAS	Unidad Medida Global	1,00	6.061.950	0	0	0	*0%*
12	PISO	Metros cuadrados	25,00	1.457.625	0	0	0	*0%*
13	DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1,00	10.039.580	0	0	0	*0%*
14	CARPINTERIA METÁLICA	Metro lineal	1,00	38.396.184	0	0	0	*0%*
15	PINTURAS	Unidad Medida Global	1,00	13.651.491	0	0	0	*0%*
16	VARIOS	Unidad Medida Global	1,00	3.374.816	0	0	0	*0%*
TOTAL				**419.702.745**	0	33.666.128	33.666.128	**8%**
		Total Certificados			**0**	33.666.128	33.666.128	
		Fondo de reparo 5%			**0**	1.683.306	1.683.306	
		Neto a cobrar			**0**	**31.982.822**	**31.982.822**	

Son Guaranies: Treinta y un millones novecientos ochenta y dos mil ochocientos veintidos.-

Sr. Rubén Darío Núñez Esquivel
Contratista
METALÚRGICA NÚÑEZ

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Cambyretá, 10 de Febrero del 2021.

Oferente: Sr. Rubén Darío Núñez Esquivel. Metalúrgica Núñez

Convocante: Municipalidad de Cambyretá.

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2020.-

ID del Llamado: 385640.-

Nombre del Llamado: TECHADO PARA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍA DE LA ESCUELA BÁSICA N° 731 SAN MIGUEL. CONTRATO N° 01/2021.-

AVANCE FÍSISCO – FINANCIERO – CERTIFICADO DE OBRAS N°1

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Teórico	16,5	33	49,5	66	82,5	100%
Real	8%	0%	0%	0%	0%	0%

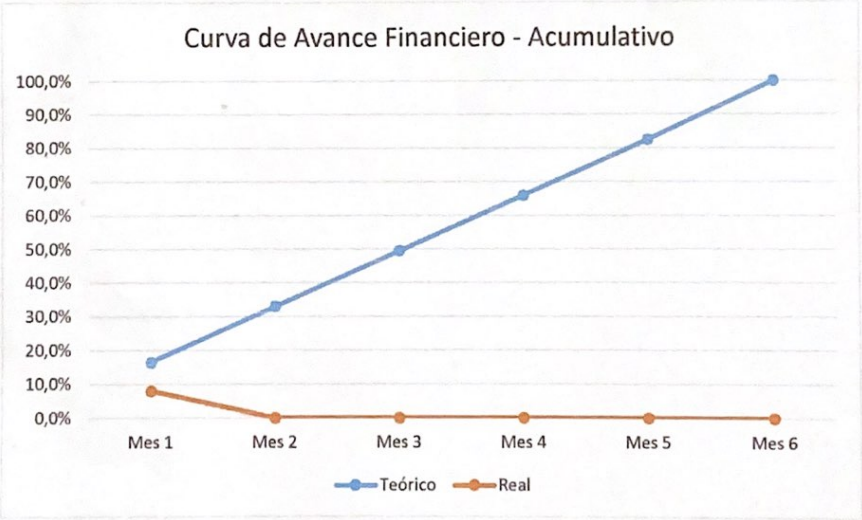

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay
