CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 26/9/2022

"Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús"

Avance de Obra: 100%

Contratación Directa Nº 39/2022 ID Nº : 417590

Fecha de Inicio: 16/09/2022

		PRESUPUESTO				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
1	Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000		800.000	100%
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.669,80	2.100	3.506.580		3.506.580	100%
3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	1.669,80	2.200	3.673.560		3.673.560	100%
4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.669,80	9.200	15.362.160		15.362.160	100%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.669,80	41.000	68.461.800		68.461.800	100%
6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.669,80	3.300	5.510.340		5.510.340	100%
7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	556,6	36.800	20.482.880		20.482.880	100%
8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	556,6	5.750	3.200.450		3.200.450	100%
9	Relleno para resguardo de cordon	Metros cúbicos	111	65.000	7.215.000		7.215.000	100%
10	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.669,80	1.200	2.003.760		2.003.760	100%
	TOTAL GENERAL				130.216.530		130.216.530	
					AVANCE DEL 100%			

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	**Gs.**	**130.216.530**
5% FONDO DE REPARO	**Gs.**	**6.510.827**
Neto a Cobrar	**Gs.**	**123.705.704**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · OBRAS PUBLICAS

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

Guarambaré, 26 de septiembre de 2.022

Señor

Ing. Oscar E. Cabrera N.

Intendente Municipal

Ciudad de Guarambaré

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar acerca del avance de Obras de los trabajos realizados por el Empresa "CONSTRU-MAPCH – de Miguel Ángel Patiño Chávez" conforme al Contrato N° 42/2022 "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL ASENTAMIENTO DIVINO NIÑO JESÚS**" según Contratación Directa (CD) N° 39/2022 ID N° 417590.

- MODALIDAD DEL LLAMADO: Contratación Directa (CD) N° 39/2.022
- OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL ASENTAMIENTO DIVINO NIÑO JESÚS" – ID N° 417590.**
- UBICACIÓN: Calle Pública del Asentamiento Divino Niño Jesús.
- INICIO DE OBRA: 16/09/2022
- AVANCE DE OBRA: 100%
- FISCALIZACIÓN: Arq. Mónica Estigarribia.

Por tanto y según verificaciones en el sitio de obras, la Empresa "**CONSTRU-MAPCH**" alcanzó un avance del 100% de lo estipulado en el contrato.

Por lo expuesto se recomienda la Recepción Provisoria de la misma.

Aprovecho para saludarle.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · OBRAS PÚBLICAS ·

.....

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

RELEVAMIENTO DE AVANCE DE OBRA

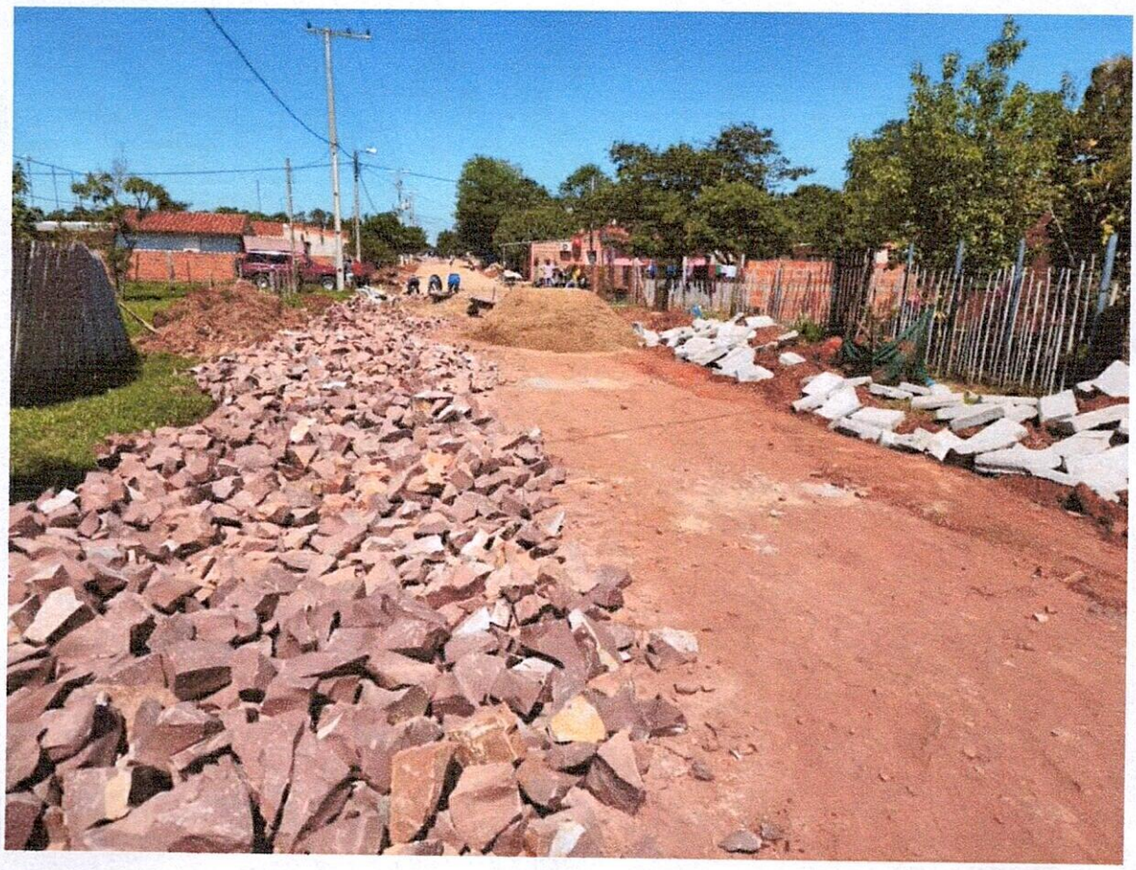

MUNICIPALIDAD DE CURUGUATY
OBRAS PUBLICAS

Mónica M. Bogarín
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228
