IOCON
TECNOLOGIA Y SERVICIOS

Fernando de la Mora, 22 de mayo del 2023

Señores

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)

Ciencias Veterinarias N° 265; San Lorenzo, Paraguay

S. / D.:

Ref.: CD – Contratación Directa

MANTENIMIENTO DE RED INFORMÁTICA Y FIBRA ÓPTICA – PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO

ID N° 403.536

Informe de Trabajos – OS 05

La empresa **INGENIERÍA DE OBRAS Y CONSULTORÍA S.R.L. (IOCON S.R.L.)**, con RUC N° 80017169-1, por medio de su representante legal, el **Sr. Manuel Alejandro Artunduaga Alarcón**, con cédula/s de identidad N° **3.605.414**, tiene el agrado de dirigirse a Uds. y por su digno intermedio a quien/es corresponda, con relación a la Contratación Pública y la Orden de Trabajo/Servicio de referencia, a los efectos manifestar y remitir, cuanto sigue:

Que, con relación a la ***Orden de Servicio N°05/2023*** fechada al 18 de mayo del 2023 y recibida por nuestra parte en fecha 19 de mayo del 2023, se procedió a la ejecución de los trabajos dentro de los plazos contractualmente establecidos y de conformidad al pliego de bases y condiciones; los cuales se detallan a continuación: -

En fecha 22 de mayo de 2023 el personal técnico de nuestra empresa procede a:

A. Cableado de Fibra Óptica del Rack principal al Rack secundario.
   1. Instalación de dos rosetas plásticas de fibra óptica
   2. Instalación de dos patch Cord UTP Cat6
   3. Instalación de dos Patch Cord FO
   4. Fusión de dos pelos de FO por extremo
   5. Instalación de dos transceiver con sus respectivos patch cord

B. Cableado de Fibra óptica del Rack principal hasta la oficina de Coordinación
   1. Instalación de dos rosetas plásticas de fibra óptica
   2. Instalación de dos patch Cord UTP Cat6
   3. Instalación de dos Patch Cord FO
   4. Fusión de dos pelos de FO por extremo
   5. Instalación de dos transceiver con sus respectivos patch cord

Recibido 23/05/23

Ing. Manuel Artunduaga A.
Representante Legal
Ingeniería de Obras y Consultoría S.R.L.
IOCON S.R.L.

IOCON S.R.L.

0000007

0000013

IOCON
TECNOLOGIA Y SERVICIOS

C. Certificación con OTDR de dos pelos fusionados

D. Etiquetado de puntos

E. Prueba de enlace

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para desearle un feliz resto de jornada.

Ing. Manuel Artunduaga A.
Representante Legal
Ingeniería de Obras y Consultoría S.R.L.
IOCON S.R.L.

Ing. Manuel A. Artunduaga A.
Representante Legal
Ingeniería de Obras y Consultoría S.R.L.
Monseñor Maricevich N° 971 c/ Ángel Torres – Paraguay
+595 21 500578
www.ioconsrl.com

IOCON S.R.L.

IOCON
TECNOLOGIA Y SERVICIOS

ANEXO DE FOTOGRAFIAS

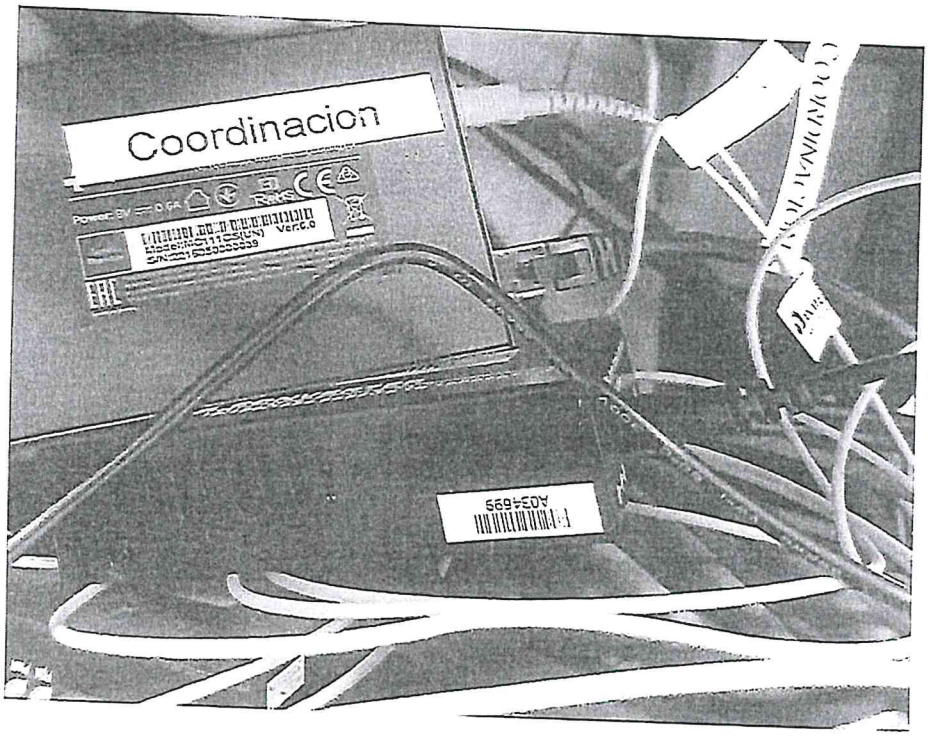

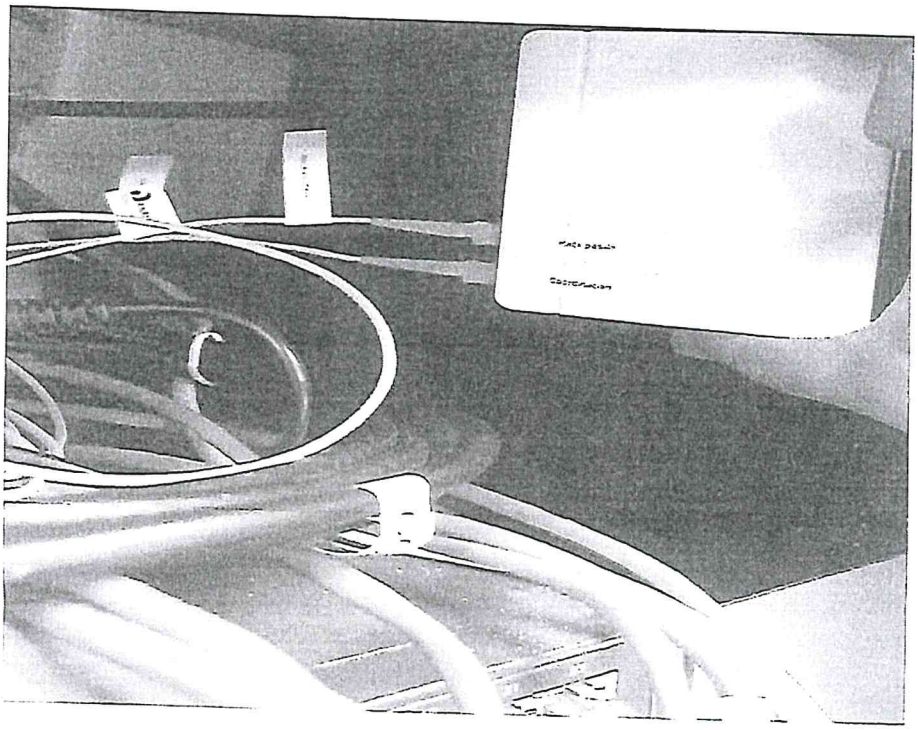

CON S.R.L.

0:00011

0:00005

IOCON
TECNOLOGIA Y SERVICIOS

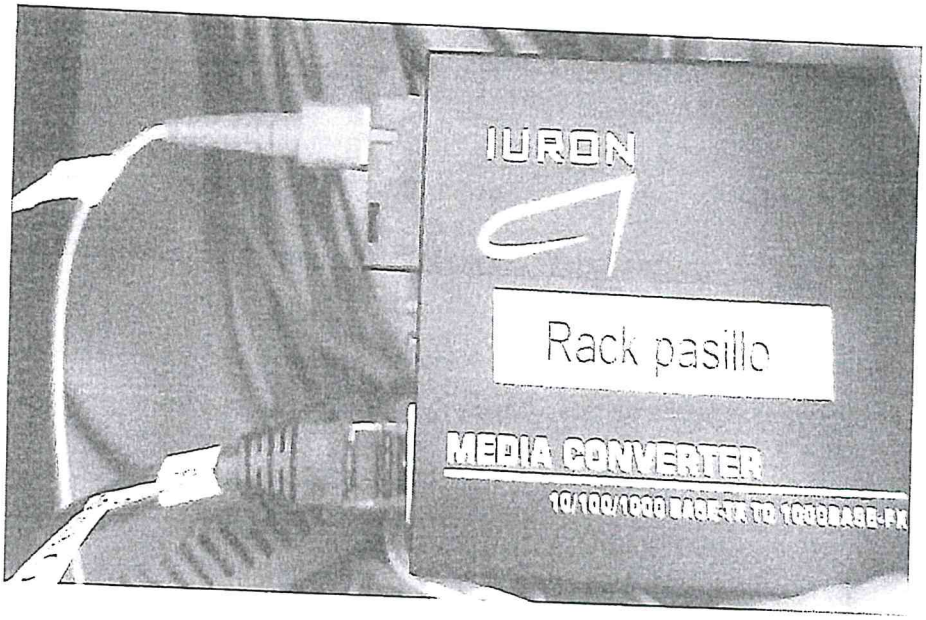

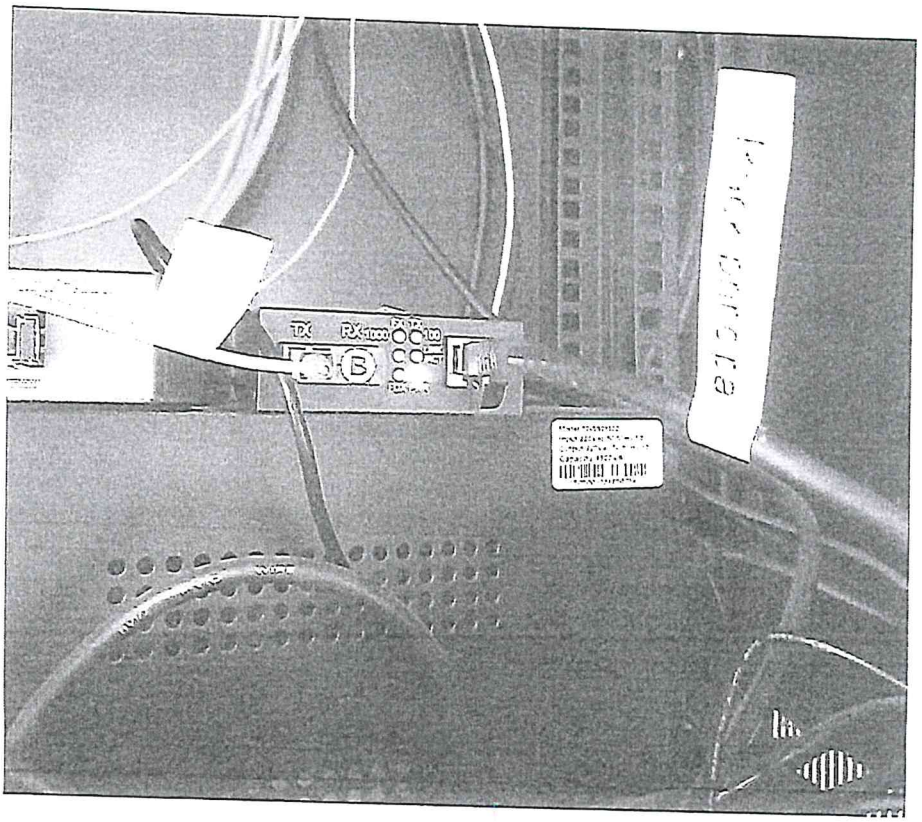

CON S.R.L.

0'00010

0'00004

IOCON
TECNOLOGIA Y SERVICIOS

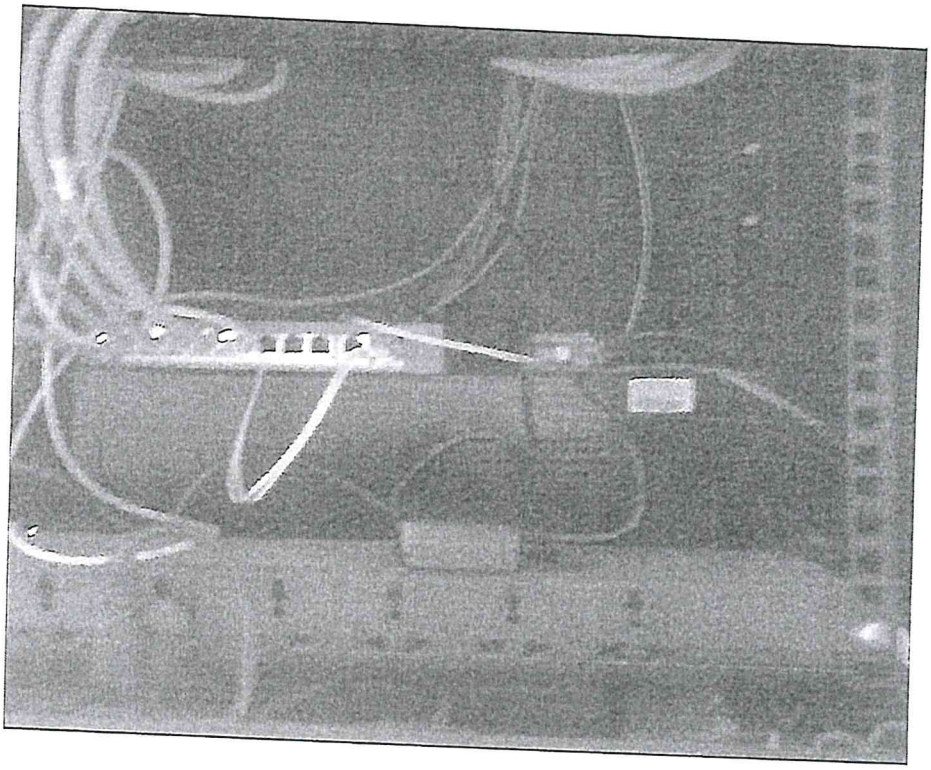

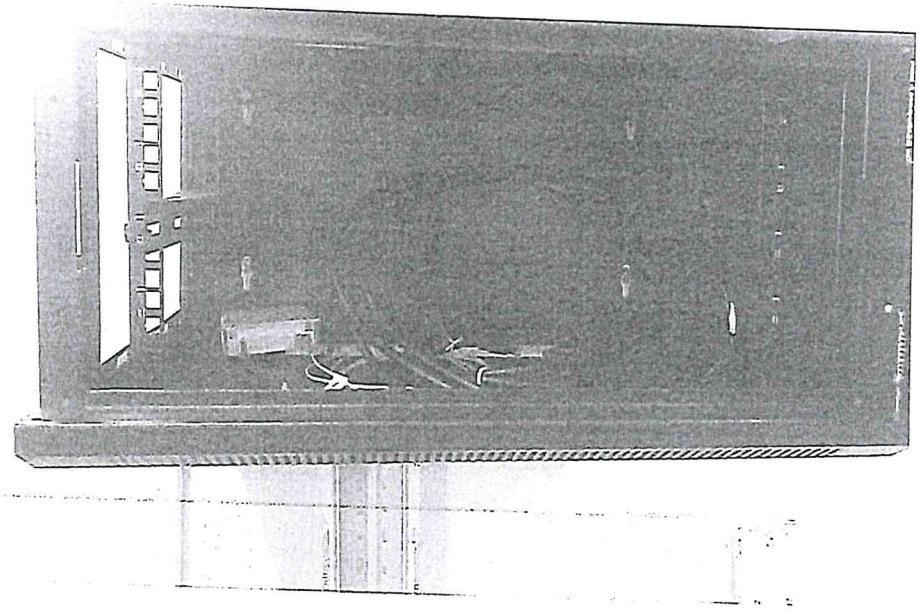

OTDR REPORT

TDR v2.23

2023-05-26 08:19:07

Job ID :
Contractor:
Customer :

Job

File : file_1310_1360.sor
Date : 2023-04-05 06:08:33
Operator:

Total Fiber Length(km) : 0.146
Total Fiber Loss(dB) : --

OverView

Average Loss(dB/km) : --
ORL(dB) : -17.385

Comment

Trace

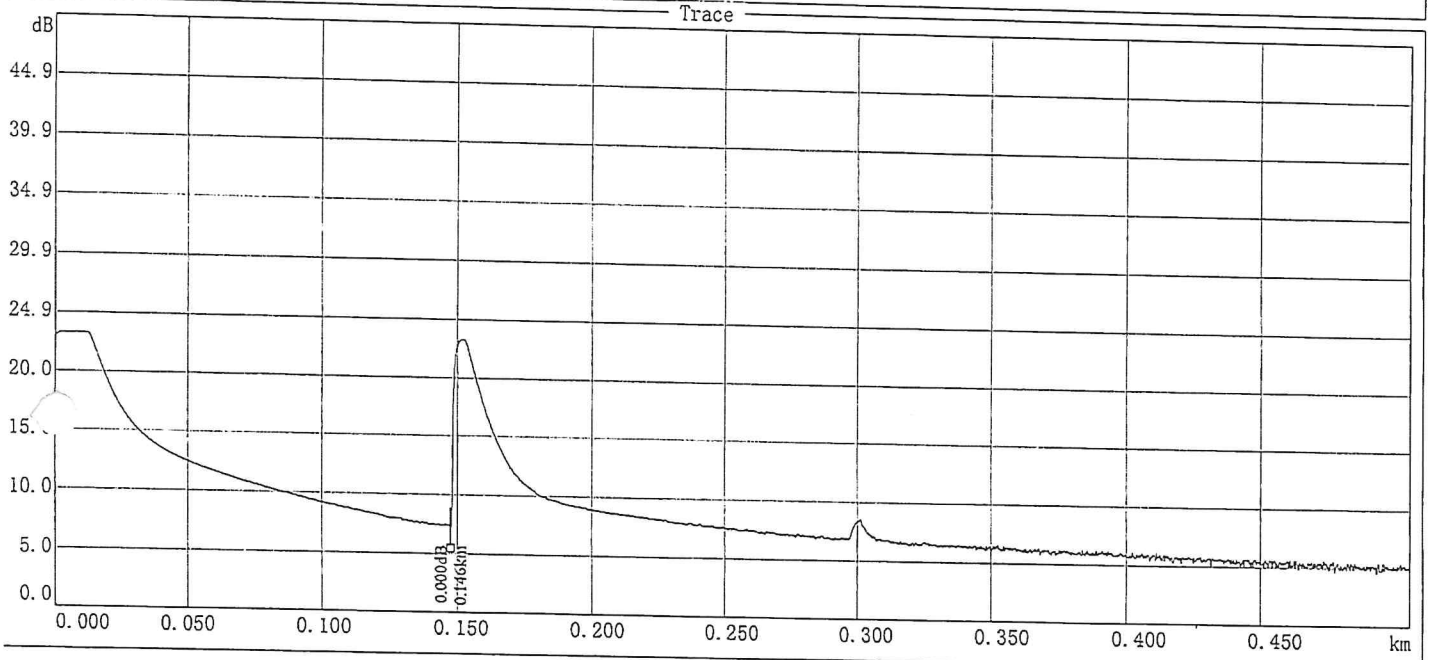

Event

Event Type	Distance(km)	Segment(km)	Loss(dB)	Total Loss(dB)	Attenuation(dB/km)	Reflectance(dB)
1NonReflect(S)	0.146	0.000	0.000	--	0.000	—
2NonReflect(E)	0.146	0.000	0.000	—	0.000	-17.385

OTDR REPORT

TDR v2.23

Job

Job ID :
Contractor:
Customer :

2023-05-26 08:19:08

File : file_1310_1361.sor
Date : 2023-04-05 06:14:32
Operator:

OverView

Total Fiber Length(km): 0.065
Total Fiber Loss(dB) : --

Average Loss(dB/km): --
ORL(dB) : -33.198

Comment

Trace

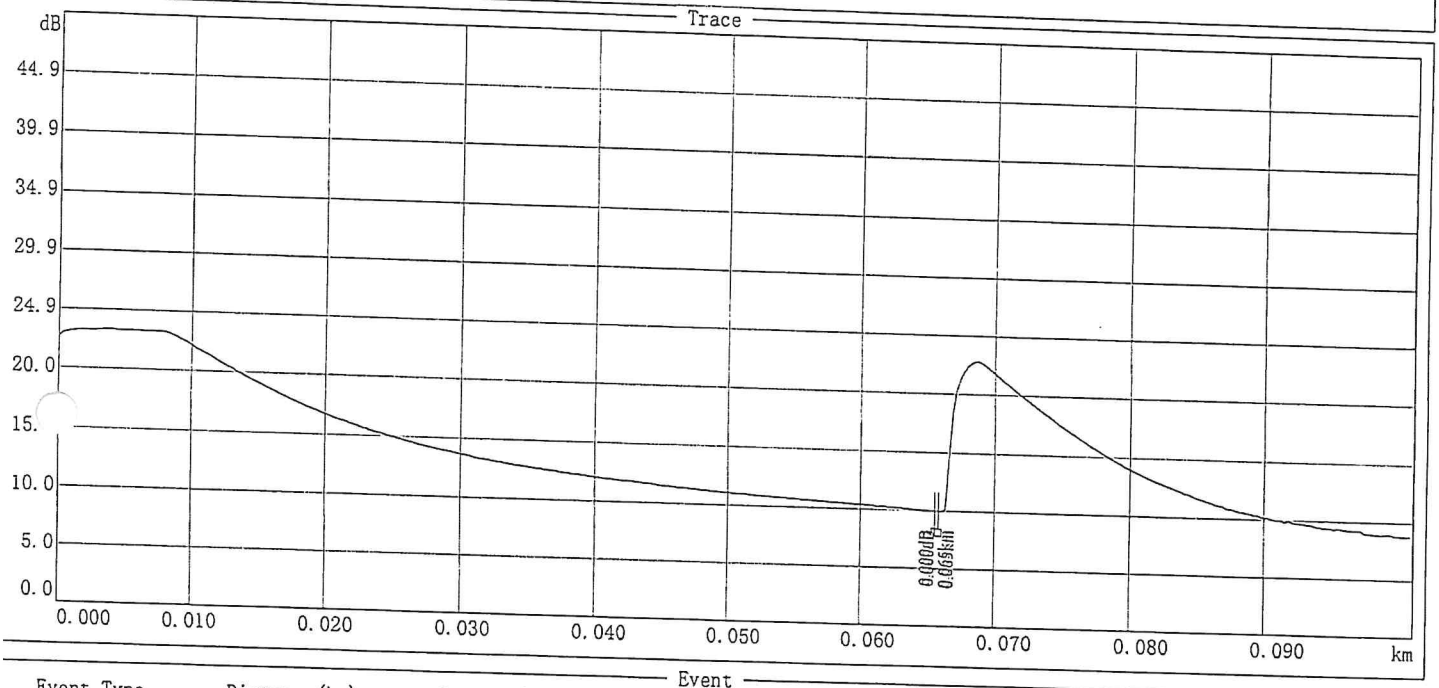

Event

Event Type	Distance(km)	Segment(km)	Loss(dB)	Total Loss(dB)	Attenuation(dB/km)	Reflectance(dB)
1NonReflect(S)	0.065	0.000	0.000	—	0.000	—
2NonReflect(E)	0.065	0.000	0.000	—	0.000	-33.198

MA
CON S.R.L.

0.00007
