GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Diciembre-Enero

AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL con ID: 436.884

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL con ID: 436.884	100%	160.591.998	0,00%	0	30,56%	49.069.060	30,56%	49.069.060
A	**Total por Contrato**	**100%**	**160.591.998**	**0,00%**	**0**	**30,56%**	**49.069.060**	**30,56%**	**49.069.060**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	32.118.400	0	9.813.812	9.813.812
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**32.118.400**	**0**	**9.813.812**	**9.813.812**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				39.255.248	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**39.255.248**	

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre-Enero**
Contrato N°:	**52/2023**
Monto Básico:	**160.591.998**
Contratista:	**Daniel Quintana Fariña**
Fecha de Inicio:	**19-dic-23**
Plazo de Ejecución (dias corridos)	**90**
Fecha de terminación prevista:	**18-mar-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

39.255.248

SON GUARANIES: Treinta y nueve millones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho.-

Daniel Quintana Fariña
Contratista-Representante Legal
ARTES EN METALES DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

3/4/24

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre-Enero

AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL con ID: 436.884			
CONTRATISTA:	Artes en Metales	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	160.591.998	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	18-mar-24
CONTRATO N°:	52/2023	**PRÓRROGA:**	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	-

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL con ID: 436.884						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	350	3.906	1.367.100	0,009	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,009	0,009	0,00	350,00	350,00	0	1.367.100	1.367.100
2	Cartel metalico con soporte -Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Unidad	1	1.045.500	1.045.500	0,007	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,007	0,007	0,00	1,00	1,00	0	1.045.500	1.045.500
3	Cimiento - Cimiento de Hormigón Ciclópeo	Metros cúbicos	19,2	638.638	12.261.850	0,076	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,076	0,076	0,00	19,20	19,20	0	12.261.851	12.261.851
4	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - TECHO CON ESTRUCTURA METALICA (Tinglado)	Metros cúbicos	350	202.991	71.046.850	0,442	0,00%	31,07%	31,07%	-	0,137	0,137	0,00	108,74	108,74	0	22.073.154	22.073.154
5	Colocacion de hormigon armado - Viga de fundación H° A°	Metros cúbicos	1,45	1.770.292	2.566.923	0,016	0,00%	75,86%	75,86%	-	0,012	0,012	0,00	1,10	1,10	0	1.947.321	1.947.321
6	Pilar - Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,5	1.770.292	885.146	0,006	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	Colocacion de hormigon armado - Vigas de H° A°	Metros cúbicos	3,08	1.819.142	5.602.957	0,035	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A°	Metros cúbicos	3,08	1.732.704	5.336.728	0,033	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Mamposteria - Muros de nivelación : De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11,57	146.449	1.694.415	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Mamposteria - Muros de nivelación : De 0,30 cm.	Metros cúbicos	15	95.593	1.433.895	0,009	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Aislacion - Aislación asfaltica : De paredes	Metros cuadrados	11,57	72.944	843.962	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Mamposteria - Muros de elevación : De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	23,06	78.977	1.821.210	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Mamposteria - Muros de elevación : De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	67,6	93.955	6.351.358	0,040	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	10	17.297	172.970	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Revoques - Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135,42	25.791	3.492.617	0,022	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Revoques - Revoques : Moldura lineal en balancines	Metro lineal	17	23.754	403.818	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	27	36.287	979.749	0,006	0,00%	74,07%	74,07%	-	0,005	0,005	0,00	20,00	20,00	0	725.740	725.740
19	Colocacion de pisos - contrapisos - De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	Metros cuadrados	27	122.048	3.295.296	0,021	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Colocacion de pisos - contrapisos - Zocalo ceramicos	Metro lineal	9	38.501	346.509	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Aberturas - Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.043.358	1.043.358	0,006	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	Aberturas - Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	890.990	1.781.980	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Aberturas - Puerta para boxes enchapados en fromica	Unidad	4	396.627	1.586.508	0,010	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Aberturas - Ventanas balancines	Metros cuadrados	2,5	223.524	558.808	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	Revoques - Alfeizar de ventanas :- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	15.385	230.775	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	Servicio de pintura - Pinturas : De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	38	15.101	573.838	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	Servicio de pintura - Pinturas : De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	38	23.595	896.610	0,006	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	Servicio de pintura - Pinturas : De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,5	24.187	253.964	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	Servicio de pintura - Pinturas : De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	2,5	29.328	73.320	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

Ing. Fernando Oraggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

30	Servicio de pintura - Pinturas : De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	67,6	21.552	1.456.915	0,009	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Servicio de pintura - Pinturas : cielorraso	Metros cuadrados	27	25.327	683.829	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Revestimiento de azulejos - Revestimientos : De azulejos	Metros cuadrados	66	70.278	4.638.348	0,029	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	2,5	147.429	368.573	0,002	0,00%	0,00%	40,00%	-	-	-	0,00	0,00	1,00	0	0	0
34	Construccion e instalaciones electricas - Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	163.890	327.780	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	170.357	1.703.570	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Construccion e instalaciones electricas - a-Soporte y Artefactos lampara de bajo consumo de 24 W	Unidad	11	144.891	1.593.801	0,010	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	2	170.357	340.714	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Instalaciones sanitarias - Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	11.176.163	11.176.163	0,070	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	Instalaciones sanitarias -Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	6.253.457	6.253.457	0,039	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,039	0,039	0,00	1,00	1,00	0	6.253.457	6.253.457
40	Instalaciones sanitarias - Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.394.937	3.394.937	0,021	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,021	0,021	0,00	1,00	1,00	0	3.394.937	3.394.937
41	Instalaciones sanitarias - Barras de asiento	Unidad	1	188.598	188.598	0,001	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Limpieza de obra	Metros cuadrados	350	1.478	517.300	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total					**160.591.998**	**100,00%**				**0,00%**	**30,56%**	**30,56%**				**0**	**49.069.060**	**49.069.060**

Daniel Quintana Farina
Contratista-Representante Legal

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oregioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

5(cinco)

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Diciembre-Enero

AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL con ID: 436.884			
CONTRATISTA:	Daniel Quintana Fariña	**FECHA DE INICIO:**	19-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	160.591.998	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	18-mar-24
CONTRATO N°:	52/2023	**PRÓRROGA:**	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	-

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL con ID: 436.884						PLAZO DE EJECUCIÓN				TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	350	3.906	1.367.100	1.367.100	0		0	0,85%
2	Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Unidad	1	1.045.500	1.045.500	1.045.500	0	0	0	0,65%
3	Cimiento - Cimiento de Hormigón Ciclópeo	Metros cúbicos	19,2	638.638	12.261.850	0	12.261.850	0	0	7,64%
4	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - TECHO CON ESTRUCTURA METALICA (Tinglado)	Metros cúbicos	350	202.991	71.046.850	0	35.523.425	35.523.425	0	44,24%
5	Colocacion de hormigon armado - Viga de fundación H° A°	Metros cúbicos	1,45	1.770.292	2.566.923	0	2.566.923	0	0	1,60%
6	Pilar - Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,5	1.770.292	885.146	0	885.146	0	0	0,55%
7	Colocacion de hormigon armado - Vigas de H° A°	Metros cúbicos	3,08	1.819.142	5.602.957	0	5.602.957	0	0	3,49%
8	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A°	Metros cúbicos	3,08	1.732.704	5.336.728	0	5.336.728		0	3,32%
9	Mamposteria - Muros de nivelación : De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11,57	146.449	1.694.415	0	1.694.415	0	0	1,06%
10	Mamposteria - Muros de nivelación : De 0,30 cm.	Metros cúbicos	15	95.593	1.433.895	0	1.433.895	0	0	0,89%
11	Aislacion - Aislación asfaltica : De paredes	Metros cuadrados	11,57	72.944	843.962	0	843.962	0	0	0,53%
12	Mamposteria - Muros de elevación : De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	23,06	78.977	1.821.210	0	1.821.210	0	0	1,13%
13	Mamposteria - Muros de elevación : De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	67,6	93.955	6.351.358	0	6.351.358	0	0	3,95%
14	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	10	17.297	172.970	0	172.970	0	0	0,11%
15	Revoques - Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135,42	25.791	3.492.617	0	0	3.492.617	0	2,17%
16	Revoques - Revoques : Moldura lineal en balancines	Metro lineal	17	23.754	403.818	0	0	403.818	0	0,25%
18	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	27	36.287	979.749	0	0	979.749	0	0,61%
19	Colocacion de pisos - contrapisos - De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	Metros cuadrados	27	122.048	3.295.296	0	0	3.295.296	0	
20	Colocacion de pisos - contrapisos - Zocalo ceramicos	Metro lineal	9	38.501	346.509	0	0	346.509	0	

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Cragnioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

21	Aberturas - Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.043.358	1.043.358	0	0	1.043.358	0	0,65%
22	Aberturas - Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	890.990	1.781.980	0	0	1.781.980	0	1,11%
23	Aberturas - Puerta para boxes enchapados en fromica	Unidad	4	396.627	1.586.508	0	0	1.586.508	0	0,99%
24	Aberturas - Ventanas balancines	Metros cuadrados	2,5	223.524	558.808	0	0	558.808	0	0,35%
25	Revoques - Alfeizar de ventanas :- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	15.385	230.775	0	0	230.775	0	0,14%
26	Servicio de pintura - Pinturas : De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	38	15.101	573.838	0	0	0	573.838	0,36%
27	Servicio de pintura - Pinturas : De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	38	23.595	896.610	0	0	0	896.610	0,56%
28	Servicio de pintura - Pinturas : De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,5	24.187	253.964	0	0	0	253.964	0,16%
29	Servicio de pintura - Pinturas : De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	2,5	29.328	73.320	0	0	0	73.320	0,05%
30	incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	67,6	21.552	1.456.915	0	0		1.456.915	0,91%
31	Servicio de pintura - Pinturas : cielorraso	Metros cuadrados	27	25.327	683.829	0	0	0	683.829	0,43%
32	Revestimiento de azulejos - Revestimientos : De azulejos	Metros cuadrados	66	70.278	4.638.348	0	0	4.638.348	0	2,89%
33	Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	2,5	147.429	368.573	0	0	368.573	0	0,23%
34	Construccion e instalaciones electricas - Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	163.890	327.780	0	0	327.780	0	0,20%
35	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	170.357	1.703.570	0	0	0	1.703.570	1,06%
36	Construccion e instalaciones electricas - a-Soporte y Artefactos lampara de bajo consumo de 24 W	Unidad	11	144.891	1.593.801	0	0	0	1.593.801	0,99%
37	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	2	170.357	340.714	0	0	0	340.714	0,21%
38	Instalaciones sanitarias - Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	11.176.163	11.176.163	0	0	0	11.176.163	6,96%
39	Instalaciones sanitarias -Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	6.253.457	6.253.457	0	0	0	6.253.457	3,89%
40	Instalaciones sanitarias - Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.394.937	3.394.937	0	0	0	3.394.937	2,11%
41	Instalaciones sanitarias - Barras de asiento	Unidad	1	188.598	188.598	0	0		188.598	0,12%
42	Limpieza de obra	Metros cuadrados	350	1.478	517.300	0	0	0	517.300	0,32%
	Total				**160.591.998**					100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						2.412.600	74.494.839	54.577.544	29.107.015	**160.591.998**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						1,50%	46,39%	33,99%	18,12%	**100%**

Daniel Quintana Fariña
Contratista-Representante Legal

ARTES EN METALES DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
Ing. Fernando Oreggioni
Coordinación de Itapúa
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Página 7

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: Diciembre-Enero

AMPLIACION DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO PIRAPO´I PRIMERA LINEA DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL con ID: 436.884

Contrato N°: 52/2023			
Monto del Contrato:	160.591.998	**Fecha de terminación prevista:**	18-mar-24
Plazo Contractual:	90	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	19-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	2.412.600	2.412.600	2.412.600	2.412.600	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Enero	74.494.839	76.907.439	46.656.460	49.069.060	44,89%	46,39%	29,05%	30,56%
Febrero	54.577.544	131.484.983		49.069.060	33,99%	80,37%		30,56%
Marzo	29.107.015	160.591.998		49.069.060	18,12%	98,50%		30,56%

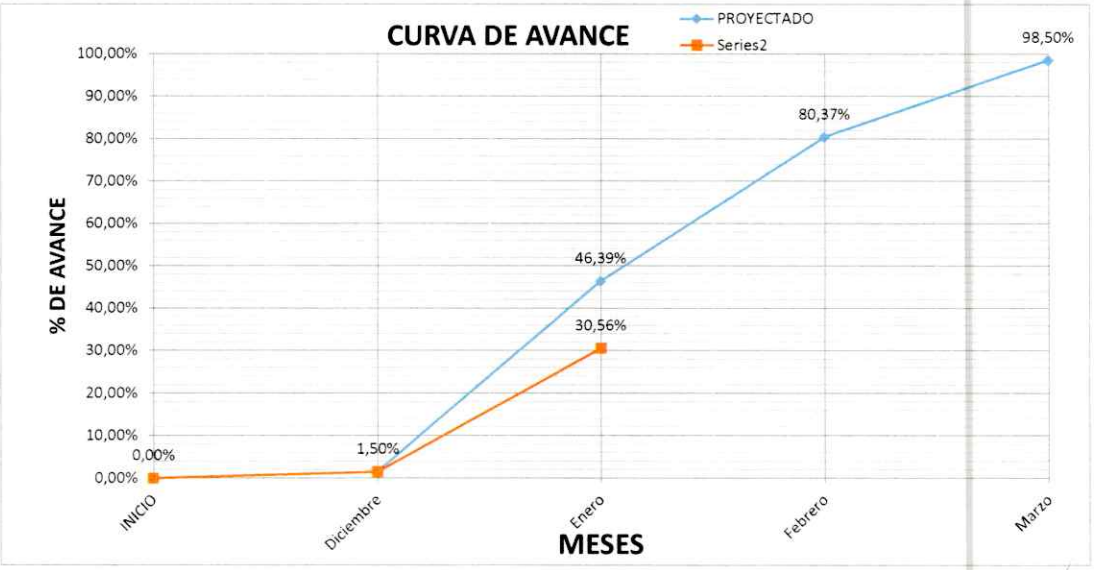

Daniel Quintana Fariña
Contratista-Representante Legal
ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Ing. Fernando Cuggiani
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

8 (ocho)

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 01 – CERTIFICADO N° 01 DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024

LICITACIÓN POR CONTRACIÓN DIRECTA Nº: 42/2023 "AMPLIACIÓN DE TECHO DE TINGLADO Y SANITARIO – PIRAPO´I PRIMERA LÍNEA – ITAPÚA POTY" – PLURIANUAL - Contrato N° 52/2023 - I. D. N° 436.884

OBRA: Ampliación de Techo de Tinglado y Sanitario – Pirapo´i - 1° Línea – Itapúa Poty
BENEFICIARIO: Localidad de Pirapo´i – Distrito de Itapúa Poty
FISCAL DE OBRAS: Ing. Fernando Oreggioni
FECHA DE VISITA: 31/Enero/2024
AVANCE DE OBRA: 30,56%
FISCAL A CARGO: Ing. Fernando Oreggioni

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Pirapo´i – 1° Línea	Itapúa Poty	160.591.998 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Daniel Quintana Fariña	0985-166-615	52/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
90 días	19/12/2023	18/03/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 31/01/2024 se ha constatado el avance de la obra de los siguientes trabajos: replanteo, cimiento de hormigón y vigas, colocación de pisos.

El avance hasta la fecha es de 30,56%, según su cronograma físico financiero correspondiente al mes de diciembre y enero.

La ejecución se está dando de forma continua y rápida, cumpliendo los plazos establecidos y las exigencias de calidad de la obra.

Se adjuntan fotografías, planilla de avance de obra, cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance.

Ing. Fernando Oreggioni
Fiscal de Obras

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

12/dic

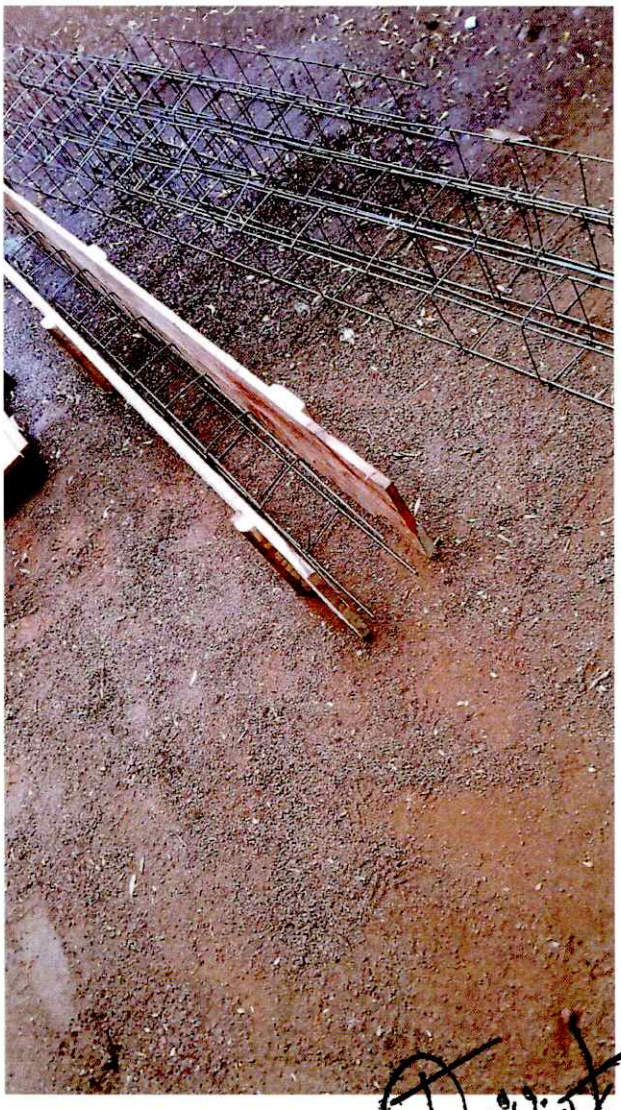

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

13/trece)
