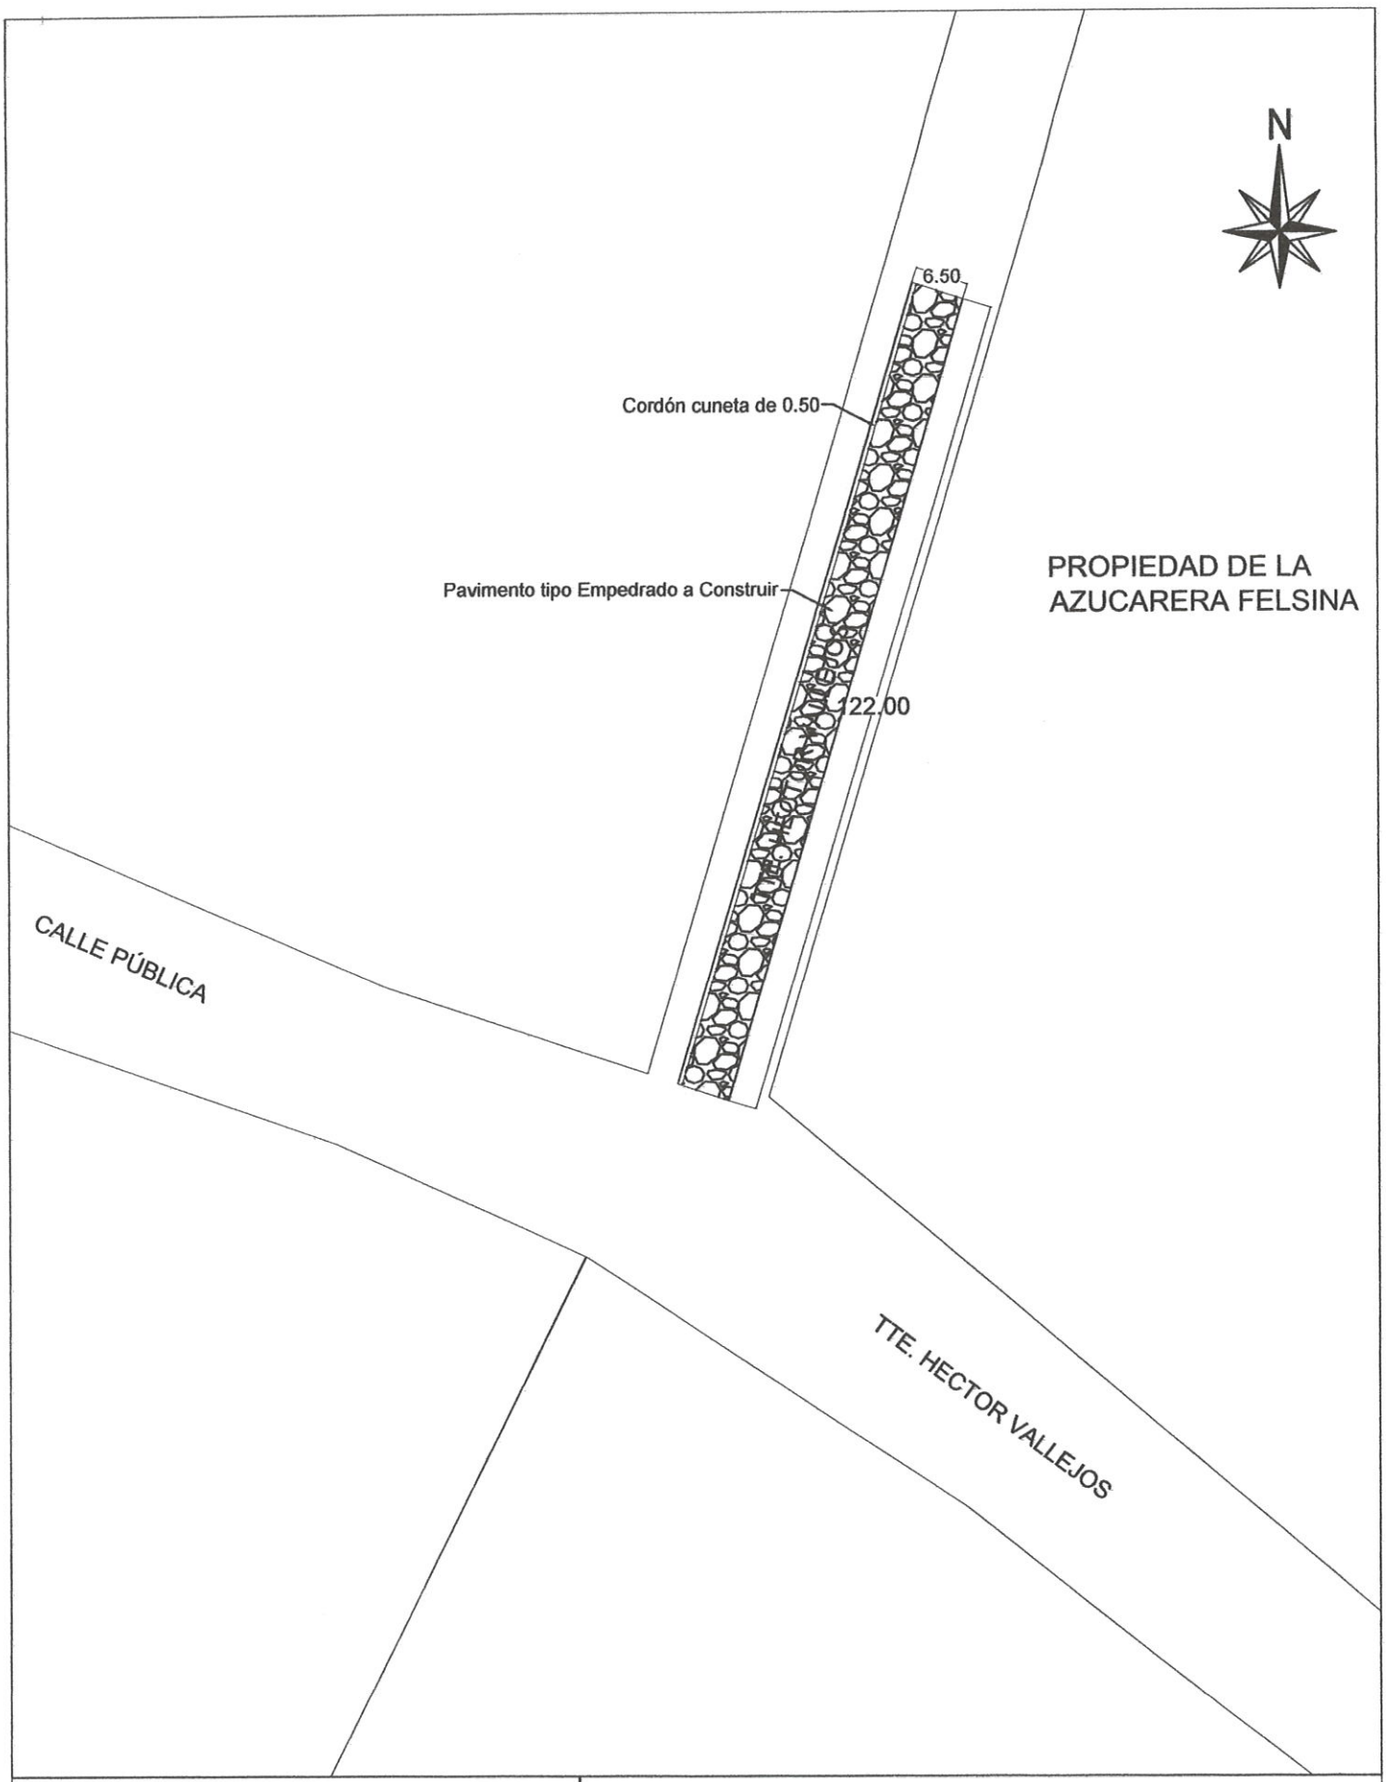

COORDENADAS UTM ZONA 21 SUR P1: N: 7181463.58; E: 453613.56 P2: N: 7181580.28; E: 453596.67	MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el B° Felsina UBICACIÓN: Tte. Héctor Vallejos y calle Pública SUPERFICIE A INTERVENIR: 793,00m² FIRMA PROFESIONAL

Municipalidad de Guarambare
Arq. Manolo Duarte
Obras Públicas

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - FELSINA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

		SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4					
S	DESCRIPCION	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7	DÍA 8	DÍA 9	DÍA 10	DÍA 11	DÍA 12	DÍA 13	DÍA 14	DÍA 15	DÍA 16	DÍA 17	DÍA 18	DÍA 19	DÍA 20	DÍA 21	DÍA 22	DÍA 23	DÍA 24
	Cartel indicador																								
	Marcación y replanteo																								
	Preparacion de terreno y de caja para empedrado																								
	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20																								
	Construcción de pavimento tipo empedrado																								
	Construcción de Piso de H°A° sobre alcantarilla																								
	Cordón cuneta de H° simple, espesor= 10 cm fck=180mpa, con junta de isopor (e= 8mm, cada 3,oo m)																								
	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio																								
	Provisión y Colocación de cordon de hormigon (30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5)																								
	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada), terminacion pintura a la cal																								
	Limpieza final de Obras																								

Municipalidad de Guarambare
Arq. Manolo Duarte
Obras Públicas
