MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

MINGA GUAZU

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: Km 30 Monday - B° Piro´y

Certificado de Obras N° 01						Certificado Actual		
Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	499.333	1.797.599	3,60	100	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	2.256,90	2.433	5.491.038	2.256,90	100	5.491.038
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	2.256,90	3.200	7.222.080	2.256,90	100	7.222.080
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	270,83	26.333	7.131.766	270,83	100	7.131.766
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	2.256,90	36.075	81.417.668	2.256,90	100	81.417.668
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	2.256,90	3.850	8.689.065	2.256,90	100	8.689.065
	Cordón de Hº							
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	644,00	39.667	25.545.548	644,00	100	25.545.548
	Compactación				0			
8	Compactación preliminar	m2	2.256,90	2.967	6.696.222	2.256,90	100	6.696.222
9	Compactación final	m2	2.256,90	3.200	7.222.080	2.256,90	100	7.222.080
	Limpieza final							
10	Limpieza final	m2	2.256,90	1.600	3.611.040	2.256,90	100	3.611.040
TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 29/2023				Total	₵ 154.824.106	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₵ 154.824.106

un unidad
m metro
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

Monto de Certificado	154.824.106
Descuento de Anticipo	-
Fondo de Reparo	7.741.205
Total a Pagar por Certificado	147.082.900

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2026

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO Nº 29 /2.023-ID: Nº 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ –NEW SONY VAIO -RUC: 80078995-4

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO Nº 29 /2.023-ID: Nº 422.716 : LOTE Nº 44 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 30 Monday-Bº Piro´y "** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO -RUC: 80078995-4.**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras
Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
NEW SONY VAIO II S.R.L.

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES - CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA

(0975) 519 708

Campo Vía, Ballivian - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 16445675
Fecha Inicio Vigencia: 01/06/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2024
R.U.C.: 80078995 - 4

FACTURA

N°001-001- 0000618

FECHA DE EMISIÓN 28 DE Noviembre DE 2023 | COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Municipalidad de Minga Guazú

DIRECCIÓN: R.U.C./C.I.: 80010478-1

TELÉFONO: NOTA DE REMISIÓN N°: FECHA: / /

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
1	Construccion de Pavimento				
	tipo Empedrado - Km 30 Monday				
	Bº Piroy - contrato Nº 29/2023				
	ID 422.796	147.082.900			147.082.900
		SUB - TOTAL			

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs. (X) US$ ( ) Ciento cuarenta y Siete millones ochenta y dos mil novecientos

TOTALES 147.082.900

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): (10%): 13.371.173 = TOTAL IVA: 13.371.173

dergraf de: Derlis Joel Peña Valenzuela - Ruc: 3672021 - 6 - Km. 14 Monday a 800 mtrs, de la Ruta Internacional N° 7, a 90 mtrs. de la Plaza Yukeri, a 20 mtrs. frente a la Iglesia San Roque - Minga Guazú - Alto Parana Cel.: (0973) 863.625 - Habilitacion N° 2260 - 01 Tal. 50x3 del 601 al 650 - Junio/2023

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Talon (No Valido como crédito fiscal)

Lote 5668280486 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270166211325

FORM.427-1

FECHA 24/11/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80078995	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/12/2023

NÚMERO DE CONTROL : 8568082C

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271800789958568082C

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2888059

NRO. CERTIFICADO: 411448

FECHA EMISION: 24-11-2023

VENCIMIENTO: 14-12-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80078995

Nro. Certificado: 411448

Razon Social: NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Actividad(es): CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 29-09-2021

Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0505-40-0657 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC

80078995-4

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 422716 / LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Monto del contrato

1.659.513.072

Año: 2023 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	JUAN TADEO	BENITEZ	Cumplio	2680373	Contratista	Activo

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Usuario Impresión: NEWSONY2012

Fecha Impresión: 04/12/2023

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC

80078995-4

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 422716 / LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Monto del contrato

1.659.513.072

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	JUAN TADEO	BENITEZ	4669932	PARCIAL	LABORAL	

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Usuario Impresión: NEWSONY2012

Fecha Impresión: 28/11/2023

Municipalidad de Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPIO
ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Av. Pioneros Del Este y Alejo Garcia - RUC: 80008881-6
Tel: (061) 501705/9 - Fax: (061) 501710
Email: mcd@mcde.gov.py - Web: mcde.gov.py

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBANTE DE INGRESO

Nro.: 2023-3-5175

Fecha: 27/01/2023

PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL - 2023/0

R.M.C.: 222213 R.U.C.: 80078995-4 - CDI:

NOMBRE: NEW SONY VAIO II S.R.L.
DOMICILIO: -
RAZÓN SOCIAL: - -RUC: 80078995-4 - CDI:-RAMO: -DIR.: -
PERIODO: 2023-1er/2do SEMESTRE -PATENTE: -FICHA: 96709 - LIQUIDACIÓN POR ACTIVIDAD
Obs.: TIPO:C, ACT: 61.245.367, CAT: P, RAMO/SUBRAMO:F41/002 TIPO:C, ACT: 61.245.367, CAT: P, RAMO/SUBRAMO:F41/002

Consulte la validez del comprobante impreso leyendo este código QR

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO E INDUSTRIA - 2023	313.687
12	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - 2023	40.000
16	IMPUESTO AL PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLA MUNICIPALES - 2023	1.800
23	TASAS POR SERVICIOS DE SALUBRIDAD - 2023	15.684
24	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION Y LUCHA C/ INSECTOS - 2023	150.000
26	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES - 2023	15.684
28	TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS - 2023	15.684
34	TASAS POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - 2023	15.684
35	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS - 2023	25.000
85	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS - 2023	6.274

Original Contribuyente

RL TIME PLAST
En Fecha:
27/01/2023

TOTAL EN GUARANÍES: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-- 599.497

impulsado por CamScanner

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

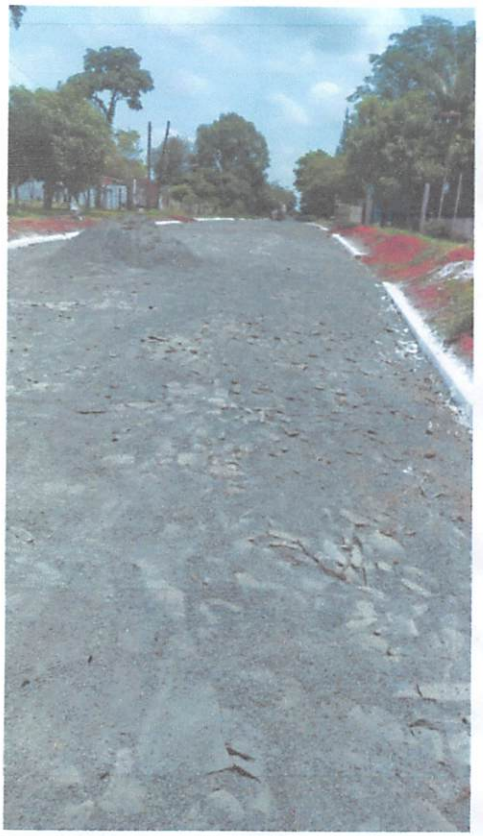

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4
